

# Note méthodologique

OFFRES DE PRIX N° 13/2025/CRISM

**CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME RÉGIONAL  
D'ACCOMPAGNEMENT ET D'INCUBATION EN FAVEUR DES PORTEURS  
DE PROJETS, TPE ET STARTUPS DE LA RÉGION SOUSS MASSA « ABRID  
INCUB »**

Réalisé par :



Pour le compte de :



المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة  
ⵎⴰⵔⵓⵔ ⵙⴰⵎⴰ ⵙⴰⵎⴰ ⵙⴰⵎⴰ ⵙⴰⵎⴰ  
Centre Régional d'investissement Souss Massa

## Sommaire

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Présentation générale de la mission .....                                       | 3  |
| 1.1. Contexte général .....                                                        | 3  |
| 1.2. Objectifs de la mission .....                                                 | 3  |
| 1.3. Portée de la mission .....                                                    | 4  |
| 2. Compréhension et consistance de la mission .....                                | 4  |
| 2.1. Compréhension globale du projet .....                                         | 4  |
| 2.2. Consistance de la mission .....                                               | 5  |
| 2.3. Lecture analytique et logique d'intervention.....                             | 8  |
| 2.4. Approche générale proposée .....                                              | 8  |
| 3. L'approche Méthodologique .....                                                 | 8  |
| 3.1. Approche méthodologique générale .....                                        | 9  |
| 3.2. Déroulement méthodologique par mission .....                                  | 10 |
| Mission 1 : Cadrage des prestations.....                                           | 10 |
| Mission 2 : Information, Sourcing et Identification des besoins .....              | 12 |
| Mission 3 : Coaching et Renforcement des Soft Skills.....                          | 15 |
| Mission 4 : Renforcement des capacités entrepreneuriales et managériales.....      | 19 |
| Mission 5 : Accompagnement pour l'amorçage et la pérennisation des activités ..... | 23 |
| 4. Outils de pilotage et de suivi .....                                            | 28 |
| 4.1. Structure du dispositif de pilotage .....                                     | 28 |
| 4.2. Principaux outils de pilotage et de suivi.....                                | 28 |
| 4.3. Proposition des indicateurs de performance .....                              | 29 |
| 4.4. Suivi-évaluation et capitalisation .....                                      | 30 |
| 4.5. Communication et reporting avec le Maître d'Ouvrage.....                      | 30 |
| 5. Moyens matériels et Logistique .....                                            | 31 |
| 5.1. Dispositif logistique général .....                                           | 31 |
| 5.2. Logistique spécifique par type d'activité .....                               | 32 |
| 6. Moyens Humains – équipe de projet .....                                         | 34 |
| 7. Organisation du projet .....                                                    | 41 |
| 7.1. Schéma de pilotage du projet .....                                            | 41 |
| 7.2. Composition et rôle de l'équipe projet .....                                  | 42 |
| 8. Planning de la mission.....                                                     | 43 |

## 1. Présentation générale de la mission

### 1.1. Contexte général

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat et de l'appui aux TPME, le **Centre Régional d'Investissement de Souss Massa (CRI-SM)** a engagé une dynamique ambitieuse visant à **stimuler la création d'entreprises, renforcer les capacités des porteurs de projets et favoriser l'émergence d'un écosystème entrepreneurial performant et inclusif** au niveau régional.

C'est dans cette optique que le CRI Souss Massa a conçu le programme régional « **ABRID** », une offre d'accompagnement intégrée, inclusive et évolutive, destinée à soutenir les porteurs d'idées, les TPE, les startups et les coopératives tout au long de leur parcours entrepreneurial. Parmi ses composantes, le programme « **ABRID INCUB** » constitue un pilier essentiel : il vise la **conception et la mise en œuvre d'un dispositif régional d'incubation et d'accompagnement** en faveur des porteurs de projets, TPE et startups de la région Souss Massa.

Ce programme, objet du présent marché, s'inscrit dans la volonté du CRI-SM de :

- Développer un **réseau d'incubation régional** adapté aux besoins du tissu économique local ;
- **Accompagner l'innovation, la créativité et l'esprit d'entreprise**, notamment chez les jeunes et les femmes ;
- **Contribuer à la création d'emplois durables** et à la valorisation du potentiel économique de la région ;
- Renforcer la **compétitivité des petites entreprises et startups régionales** à travers un appui ciblé et structuré.

### 1.2. Objectifs de la mission

L'objectif global du marché est la **conception et la mise en œuvre effective du programme régional d'accompagnement et d'incubation "ABRID INCUB"**, destiné à **105 bénéficiaires** répartis sur les six préfectures et provinces de la région Souss Massa, dont **70 porteurs de projets/TPE** et **35 startups**.

Les objectifs spécifiques de la mission sont :

- Élaborer un dispositif opérationnel d'incubation et d'accompagnement cohérent avec la stratégie du CRI-SM ;
- Identifier, mobiliser et sélectionner les porteurs de projets selon des critères clairs et équitables ;

- Renforcer les **soft skills**, les compétences entrepreneuriales et managériales des bénéficiaires ;
- Accompagner les porteurs de projets dans la **création, l'amorçage et la pérennisation** de leurs entreprises ;
- Faciliter leur **intégration dans les réseaux économiques, d'investissement et d'innovation** régionaux ;
- Promouvoir une approche d'accompagnement **inclusive, collaborative et orientée résultats**.

### 1.3. Portée de la mission

La mission comprend cinq phases principales :

| Mission          | Intitulé                                                           | Contenu général                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mission 1</b> | <i>Cadrage des prestations</i>                                     | Élaboration de la note de cadrage, méthodologie, planification, stratégie de communication et grille de sélection. |
| <b>Mission 2</b> | <i>Information, sourcing et identification des besoins</i>         | Communication, appel à projets, sélection des 105 bénéficiaires, diagnostic initial et préparation du programme.   |
| <b>Mission 3</b> | <i>Coaching et renforcement des soft skills</i>                    | Renforcement des compétences comportementales et relationnelles des porteurs de projets.                           |
| <b>Mission 4</b> | <i>Renforcement de capacités entrepreneuriales et managériales</i> | Formation et accompagnement en gestion, planification, finance, marketing, et management.                          |
| <b>Mission 5</b> | <i>Accompagnement pour l'amorçage et la pérennisation</i>          | Appui individualisé à la création, au lancement, à la structuration et à la mise en réseau des bénéficiaires.      |

Ces cinq missions seront menées sur une période globale de **290 jours calendaires**, dans un esprit de **co-crédation, proximité et performance**.

## 2. Compréhension et consistance de la mission

### 2.1. Compréhension globale du projet

Le programme « **ABRID INCUB** », initié par le **Centre Régional d'Investissement Souss Massa (CRI-SM)**, vise à créer un **dispositif régional intégré d'incubation, d'accompagnement et de financement** au profit des **porteurs d'idées de projets, TPE et startups innovantes**.

Notre compréhension du CPS met en évidence une volonté du CRI-SM de **passer d'un accompagnement ponctuel à un modèle intégré, cohérent et mesurable**, qui combine :

- **Formation,**
- **Coaching individuel et collectif,**
- **Accès au financement,**
- **Mise en réseau.**

Le programme s'articule autour d'un **parcours entrepreneurial complet** allant du cadrage stratégique jusqu'à l'amorçage et la pérennisation des activités.

## **2.2. Consistance de la mission**

La mission comprend **cinq composantes principales**, correspondant à cinq missions complémentaires et progressives.

Le tableau ci-dessous en présente la **structure, les objectifs, les principales activités et les livrables attendus** :

| Mission                                                                | Objectif principal                                                                                                                 | Principales activités à réaliser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Livrables attendus                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mission 1 : Cadrage des prestations</b>                             | Élaborer la feuille de route stratégique et opérationnelle du programme « ABRID INCUB ».                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Élaboration de la <b>note de cadrage</b> (contexte, objectifs, méthodologie, moyens logistiques et humains, stratégie de communication).</li> <li>Définition des <b>grilles de sélection</b> des bénéficiaires. <ul style="list-style-type: none"> <li>Planification du déploiement régional.</li> </ul> </li> <li>Validation du dispositif avec le maître d'ouvrage et le comité de suivi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Note de cadrage complète et validée. <ul style="list-style-type: none"> <li>Planning prévisionnel d'exécution.</li> </ul> </li> <li>Grilles de sélection validées.</li> </ul>                                                                      |
| <b>Mission 2 : Information, sourcing et identification des besoins</b> | Assurer la <b>communication, la mobilisation et la sélection</b> des bénéficiaires du programme.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conception et diffusion de supports de communication. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lancement et gestion de l'<b>appel à projets</b>.</li> <li>Organisation des <b>entretiens de présélection</b>.</li> </ul> </li> <li>Évaluation et sélection de <b>105 bénéficiaires</b> (70 TPE et 35 startups).</li> <li>Organisation de la <b>cérémonie de lancement (kick-off)</b>.</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport de synthèse sur la communication et la sélection.</li> <li>Liste validée des bénéficiaires et liste de réserve.</li> <li>PV de délibération et grilles d'évaluation.</li> <li>Clé USB contenant les supports, photos et vidéos.</li> </ul> |
| <b>Mission 3 : Coaching et renforcement des soft skills</b>            | Renforcer les <b>compétences personnelles et comportementales</b> des bénéficiaires pour consolider leur posture entrepreneuriale. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Organisation d'ateliers de <b>coaching individuel et collectif</b>.</li> <li>Développement des <b>soft skills</b> : communication, leadership, gestion du stress, travail en équipe, confiance en soi.</li> <li>Élaboration de <b>bilans personnels</b> et fiches d'évaluation.</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Planning des sessions de coaching.</li> <li>Bilans de compétences personnelles.</li> <li>Feuilles de présence et fiches d'évaluation.</li> <li>Rapport de synthèse et capsule vidéo best of.</li> </ul>                                            |

| Mission                                                                                 | Objectif principal                                                                                                                                  | Principales activités à réaliser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Livrables attendus                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mission 4 :<br/>Renforcement des capacités entrepreneuriales et managériales</b>     | Doter les bénéficiaires des <b>compétences techniques et managériales</b> nécessaires à la création et à la gestion de leurs entreprises.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formations sur : business model, étude de marché, gestion comptable et financière, fiscalité, marketing digital, RH, droit commercial.</li> <li>• Coaching pour la <b>validation du business plan (BP)</b>.</li> <li>• Appui à la <b>formalisation juridique</b> des projets.</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapports de formation et feuilles de présence.</li> <li>• Bilans de compétences managériales.</li> <li>• Fiches d'évaluation et capsules vidéos thématiques.</li> </ul>                                                                                             |
| <b>Mission 5 :<br/>Accompagnement pour l'amorçage et la pérennisation des activités</b> | Assurer un <b>suivi individualisé</b> des bénéficiaires pour consolider leurs activités et faciliter leur intégration dans l'écosystème économique. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accompagnement de <b>120 jours</b> post-crétation.</li> <li>• Élaboration des <b>plans d'aide à la pérennisation</b>.</li> <li>• Formation sur la <b>soumission aux appels d'offres</b>.</li> <li>• Organisation d'actions de <b>réseautage, B2B et rencontres de financement</b>.</li> <li>• Suivi mensuel de la performance des projets.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plans de pérennisation individuels.</li> <li>• Tableaux de bord de suivi par bénéficiaire.</li> <li>• Rapports mensuels d'accompagnement.</li> <li>• Bilans des actions de réseautage et de financement.</li> <li>• Capsules vidéo best of par province.</li> </ul> |

## 2.3. Lecture analytique et logique d'intervention

L'analyse des cinq missions met en évidence une **progression logique et complémentaire** entre les différentes étapes :

| Phase                | Finalité                                         | Nature des interventions                           |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Cadrage</b>       | Structurer et planifier                          | Stratégie, outils, grilles, logistique             |
| <b>Mobilisation</b>  | Identifier et engager les bénéficiaires          | Communication, sélection, lancement                |
| <b>Renforcement</b>  | Former et développer les compétences             | Coaching, soft skills, compétences techniques      |
| <b>Création</b>      | Structurer les projets et formaliser les entités | Business plan, statut juridique, gestion           |
| <b>Pérennisation</b> | Accompagner la croissance et la durabilité       | Financement, réseautage, suivi post-accompagnement |

*Cette architecture traduit une **vision de l'accompagnement en continuum**, passant du diagnostic initial à la création et à la consolidation des projets.*

## 2.4. Approche générale proposée

La méthodologie proposée repose sur une approche **intégrée, participative et orientée impact**, articulée autour des principes suivants :

### 1. Ancrage territorial fort

Les actions seront planifiées et déployées dans l'ensemble des préfectures et provinces de la région Souss Massa, en partenariat avec les acteurs locaux de l'écosystème entrepreneurial.

### 2. Ciblage rigoureux et accompagnement sur mesure

Chaque bénéficiaire fera l'objet d'un diagnostic individualisé et d'un accompagnement personnalisé selon la maturité de son projet (pré-crédation, création ou amorçage).

### 3. Méthodes d'apprentissage actives

Les formations, ateliers et coachings seront basés sur des pédagogies interactives, des cas pratiques, des travaux de groupe et du mentoring terrain.

### 4. Synergie avec les partenaires régionaux

Une collaboration étroite sera assurée avec les institutions publiques, financières et associatives (banques, CGEM, OFPPT, ANAPEC, INDH, universités, etc.) pour renforcer l'efficacité et la durabilité du programme.


### 5. Capitalisation et diffusion

L'ensemble des livrables (rapports, vidéos, fiches, outils digitaux) servira à capitaliser les acquis et à alimenter les prochaines initiatives du CRI-SM.

## 3. L'approche Méthodologique



### 3.1. Approche méthodologique générale

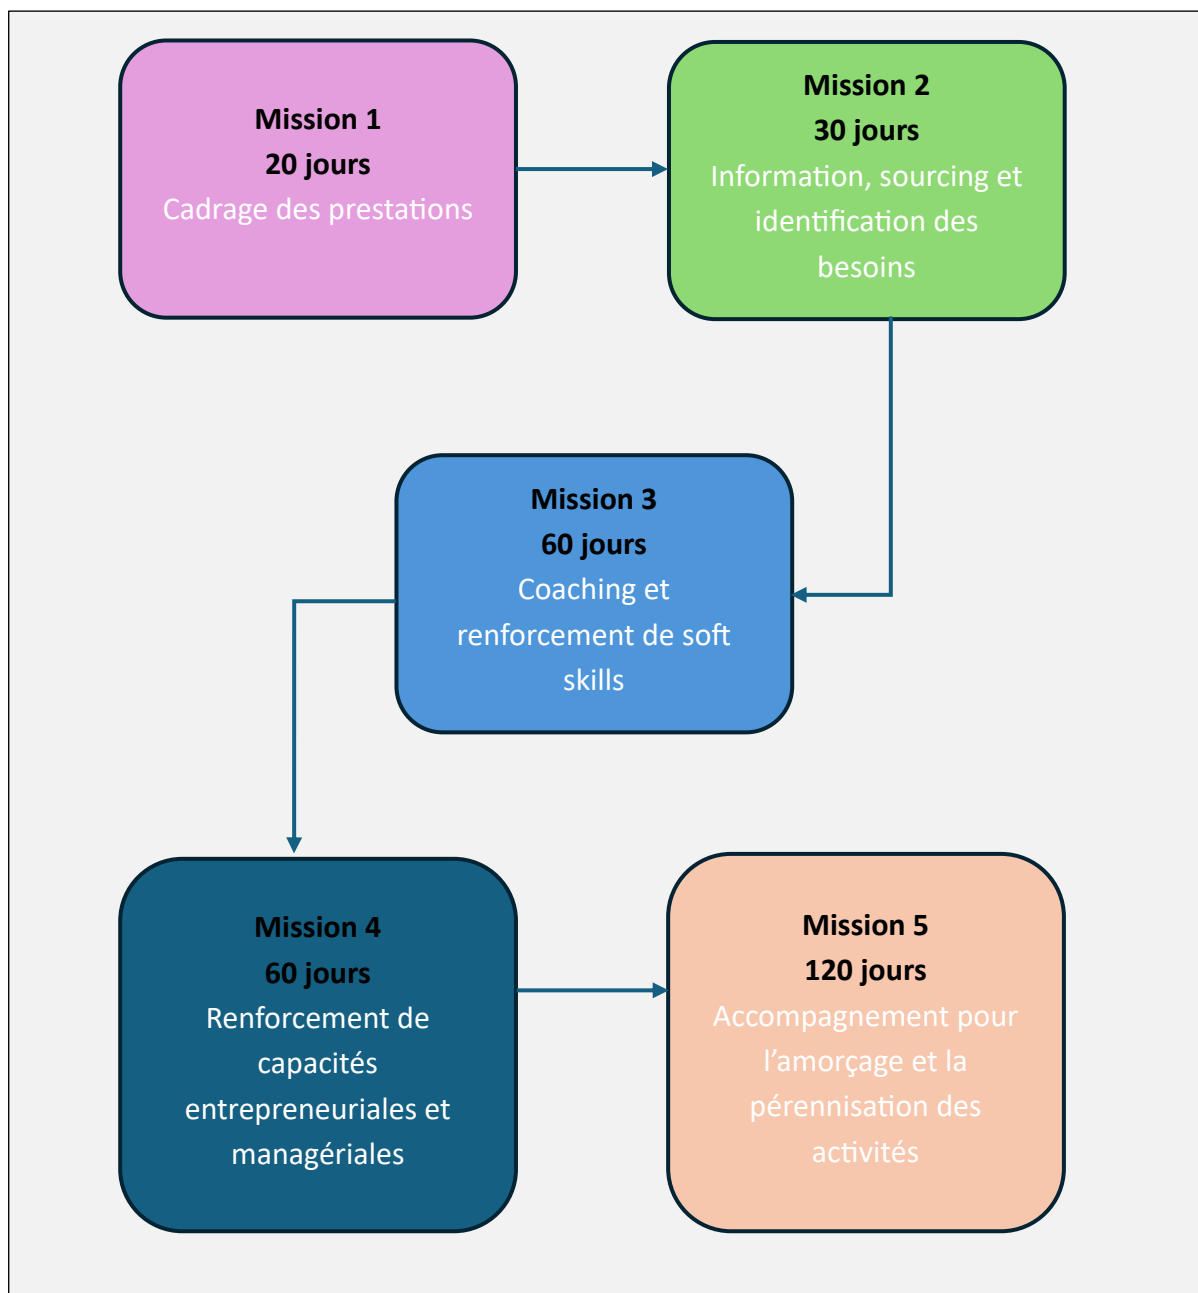

### 3.2. Déroulement méthodologique par mission

---

#### Mission 1 : Cadrage des prestations

##### Objectif de la mission

La Mission 1 constitue la **phase préparatoire et stratégique** du programme **ABRID INCUB**. Elle vise à **établir la feuille de route globale** du projet, définir les outils de gestion, préciser l'organisation opérationnelle et valider, en concertation avec le maître d'ouvrage, **le cadre méthodologique, logistique et temporel** qui régira la mise en œuvre de l'ensemble des missions suivantes.

---

##### Méthodologie de mise en œuvre

La méthodologie proposée pour la réalisation de cette première mission se déroulera en **trois grandes étapes complémentaires**, permettant de garantir une préparation complète, structurée et validée par toutes les parties prenantes.

---

##### Étape 1 : Analyse préparatoire et compréhension du mandat

Cette étape permettra d'assurer une compréhension approfondie du marché et de ses exigences :

- **Analyse du CPS, du RC et des documents de référence** liés au programme régional d'incubation ABRID INCUB ;
- **Prise de contact et réunion de démarrage** avec le maître d'ouvrage pour harmoniser la compréhension du contexte, des objectifs et des attentes ;
- **Collecte d'informations complémentaires** sur les programmes régionaux existants, les partenaires potentiels (OFPPT, ANAPEC, INDH, CGEM, etc.), et les besoins spécifiques du territoire ;
- Identification des **enjeux clés, contraintes logistiques et opportunités locales** pour la mise en œuvre efficace du programme.

◆ **Livrable intermédiaire** : Compte rendu de la réunion de démarrage (kick-off meeting) et plan de travail détaillé validé par le maître d'ouvrage.

---

## Étape 2 : Élaboration de la note de cadrage

Sur la base des échanges et des éléments du diagnostic, le titulaire élaborera une **note de cadrage complète** comprenant l'ensemble des éléments exigés par le CPS :

### 1 Contexte et objectifs du projet

- Présentation du cadre global du programme ABRID INCUB et des objectifs du marché.

### 2 Méthodologie de gestion du programme d'incubation

- Approche de planification, d'exécution, de suivi et d'évaluation ;
- Outils de gestion (tableaux de bord, reporting, suivi des bénéficiaires).

### 3 Stratégie et outils de communication

- Proposition d'une stratégie de communication multicanale (médias locaux, réseaux sociaux, supports visuels) ;
- Validation des visuels et messages institutionnels avant diffusion.

### 4 Organisation et moyens logistiques

- Présentation de tous les moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la mise en œuvre (salles, équipements, déplacements, supports).

### 5 Équipe projet et chronogramme d'affectation

- Présentation nominative de l'équipe projet, accompagnée d'un **tableau d'affectation** du personnel par mission et par durée.

### 6 Planning prévisionnel d'exécution

- Détail des activités, échéances et durées pour chacune des cinq missions ;
- Proposition d'un **planning type Gantt** illustrant les chevauchements et dépendances.

### 7 Grille de notation des candidats (sélection des bénéficiaires)

- Conception d'une grille transparente et objective alignée sur les critères du programme : innovation, faisabilité, motivation, impact socio-économique, etc.

◆ **Livrable principal : Note de cadrage complète et validée** comprenant tous les éléments ci-dessus.

---

## Étape 3 : Validation et cadrage opérationnel

- Organisation d'une **réunion de validation** avec le **maître d'ouvrage** et le **Comité de Suivi du Programme régional intégré d'accompagnement**.
- Présentation orale de la note de cadrage et ajustement sur la base des observations formulées.
- Validation finale du document comme **référence de pilotage** pour le reste du programme.
- Signature du procès-verbal de validation et lancement officiel de la **phase opérationnelle (Mission 2)**.

◆ **Livrables finaux :**

- Note de cadrage validée par le maître d'ouvrage ;
- PV de validation de la réunion de cadrage ;
- Clé USB contenant la version numérique du document, le planning et la grille de notation.

---

## Mission 2 : Information, Sourcing et Identification des besoins

### Objectif de la mission

Cette mission a pour objectif d'assurer la **préparation, la communication et le lancement officiel du programme ABRID INCUB**, tout en garantissant la **sélection rigoureuse des 105 bénéficiaires** (70 porteurs de projets/TPE et 35 startups) sur la base de critères objectifs, équitables et validés par le **Maître d'Ouvrage**.

Elle vise également à **concevoir la configuration finale du programme d'incubation** (modules, logistique, groupes, formateurs, conventions), et à organiser la **cérémonie "Kick-off"** marquant le démarrage opérationnel du programme dans chaque préfecture et province.

---

### Méthodologie de mise en œuvre

La méthodologie proposée se déroule en **deux grandes étapes**, conformément au CPS.

#### □ **Étape 1 : Communication, Sourcing et Sélection des candidats**

##### ▢ **Préparation de la communication et des outils**

- Élaboration d'une **présentation complète du programme** : contexte, objectifs, cible, phases, retombées attendues, KPIs et calendrier global.
- Définition, en concertation avec le Maître d'Ouvrage, de la **stratégie de communication multicanale** : médias locaux, réseaux sociaux, sites institutionnels, affichage, radios, etc.

- Rédaction du **draft de l'appel à projets** précisant les critères d'éligibilité, les délais, les modalités d'inscription et le processus de sélection.
- Conception des **supports visuels et contenus** : affiches, flyers, vidéos, formulaires bilingues (français/arabe).
- Soumission des supports à la **validation du CRI-SM**, avant impression et diffusion.

## 2. Lancement de la campagne d'information et de sourcing

- Déploiement d'une **campagne régionale de sensibilisation** dans les six préfectures et provinces de Souss Massa.
- Coordination avec les partenaires territoriaux (ANAPEC, OFPPT, INDH, Chambres professionnelles, CGEM, associations locales).
- Organisation d'ateliers d'information et de présentation du programme.
- Suivi du nombre et de la répartition géographique des candidatures reçues.

## 3. Réception, tri et évaluation des candidatures

- Centralisation des candidatures physiques et en ligne.
- **Pré-filtrage** selon les conditions d'éligibilité (âge, statut, localisation, maturité du projet, secteur).
- Élaboration, avec le Maître d'Ouvrage, d'une **matrice multicritère de sélection** (innovation, faisabilité, impact socio-économique, potentiel d'emploi, motivation).
- Organisation des **entretiens individuels de sélection**, avec toute la logistique.
- Évaluation de chaque candidat via la **grille de notation validée**.

## 4. Sélection finale et validation

- Compilation et traitement des résultats : nombre total de candidatures, répartition par province, âge, genre, niveau scolaire, statut juridique et secteur d'activité.
- Présentation des résultats au Maître d'Ouvrage pour validation.
- Établissement de la **liste principale** (105 bénéficiaires) et d'une **liste de réserve** pour pallier d'éventuelles défections.
- Rédaction du **procès-verbal de délibération** signé par le comité de sélection.
- Communication officielle des résultats aux candidats.

## 5. Préparation de la cérémonie de lancement "Kick-off"

- Planification et organisation d'une **réception de lancement** du programme dans chaque préfecture et province.

- Préparation de la logistique (lieux, matériel, signalétique, invitations).
- Invitation des partenaires institutionnels et des bénéficiaires retenus.
- Présentation du programme, de l'équipe projet et des prochaines étapes.

◆ *Livrables de l'étape 1 :*

- Rapport de synthèse détaillant :
  - La présentation du programme (contexte, objectifs, KPIs) ;
  - Les outils et supports de communication utilisés ;
  - L'appel à projets validé ;
  - Le planning de la mission 2 ;
  - La matrice multicritère et les grilles d'évaluation ;
  - La liste principale (105) et la liste de réserve ;
  - Les PV de délibération signés ;
  - La présentation statistique des candidats (âge, genre, province, maturité, etc.).

## □ Étape 2 : Préparation du programme d'incubation

### ▣ Organisation logistique et configuration du programme

- Préparation de **tous les moyens logistiques** nécessaires au déploiement (espaces, matériel, outils digitaux, transport, hébergement si requis).
- Proposition d'une **configuration pédagogique complète** :
  - Structure du parcours d'incubation (pédagogie adoptée, enchaînement des phases) ;
  - Groupes homogènes de bénéficiaires ;
  - Modules de formation et coaching multidisciplinaires ;
  - Méthodologie et calendrier d'intervention ;
  - Identification des coaches, formateurs et assistants.
- Validation de la configuration par le Maître d'Ouvrage.

### ▣ Conventions et organisation du kick-off

- Rédaction et signature des **conventions d'accompagnement** avec les candidats sélectionnés.
- Organisation des **cérémonies "Kick-off"** validées par le CRI-SM : une par préfecture/province.
- Invitation des partenaires économiques et institutionnels à ces événements.

- Présentation de la **version mise à jour de la liste des bénéficiaires** et de l'équipe projet (formateurs, coaches, assistants).

◆ **Livrables de l'étape 2 :**

- Rapport de synthèse incluant :
  - La configuration du programme d'incubation validée ;
  - Les supports de formation et de coaching ;
  - La présentation de l'équipe d'animation ;
  - Les conventions d'accompagnement signées ;
  - Une clé USB contenant photos, vidéos et **capsule "best of"** par province.

---

### Mission 3 : Coaching et Renforcement des Soft Skills

#### **Objectif de la mission**

La Mission 3 vise à **renforcer les capacités personnelles, comportementales et relationnelles** des porteurs de projets, TPE et startups accompagnés dans le cadre du programme **ABRID INCUB**.

Elle a pour finalité de **qualifier les bénéficiaires en matière de soft skills** afin de leur fournir les prérequis indispensables pour réussir leurs activités entrepreneuriales, mieux gérer leurs projets, interagir efficacement avec les partenaires et développer un **leadership adapté au monde de l'entreprise**.

Les objectifs spécifiques de cette mission sont :

- Identifier et qualifier le niveau initial de soft skills des bénéficiaires ;
- Développer leurs compétences personnelles à travers des ateliers pratiques et des coachings individualisés ;
- Favoriser le travail collaboratif, la confiance en soi, la gestion du stress et la communication positive ;
- Accompagner chaque participant à **dresser un bilan personnel de ses aptitudes et axes d'amélioration**.

---

#### **Méthodologie de mise en œuvre**

Le déroulement de la mission suivra une approche participative et progressive, articulée en **trois principales étapes**.

---

## □ Étape 1 : Diagnostic et planification du programme de coaching

### 1 Diagnostic initial et profilage des bénéficiaires

- Analyse des résultats de la sélection (Mission 2) et identification des besoins spécifiques en soft skills selon les profils (TPE, startups, porteurs d'idées).
- Réalisation de **questionnaires d'auto-évaluation** et d'entretiens individuels pour établir un **profil de compétences personnelles** pour chaque bénéficiaire.
- Élaboration d'un **bilan de départ individuel** : forces, points d'amélioration, objectifs personnels à atteindre.

### 2 Conception du plan de formation et de coaching

- Définition d'un **programme modulaire** validé par le Maître d'Ouvrage, structuré autour de thématiques prioritaires :
  - a) Confiance en soi et affirmation personnelle ;
  - b) Communication bienveillante et négociation ;
  - c) Gestion du temps et des priorités ;
  - d) Résolution de conflits et travail collaboratif ;
  - e) Tolérance au stress et résilience ;
  - f) Planification, fixation d'objectifs et exécution efficace ;
  - g) Esprit d'équipe et leadership partagé ;
  - h) Prise de parole en public et expression devant les parties prenantes.
- Planification des **sessions collectives et individuelles**, avec un calendrier détaillé et validé par le Maître d'Ouvrage.
- Mobilisation des **coachs certifiés** et des formateurs expérimentés dans le développement personnel et la communication.

### 3 Validation du planning et logistique

- Soumission du planning des sessions à la validation du CRI-SM (tout changement ultérieur fera l'objet d'une notification écrite au moins une semaine à l'avance).
  - Préparation logistique (salles, matériel pédagogique, supports de formation, documents d'évaluation).
- 

## □ Étape 2 : Mise en œuvre des ateliers et coachings

### 1 Déroulement des sessions collectives



- Animation de **workshops interactifs et dynamiques** favorisant la participation active et la co-construction.
- Utilisation de méthodes pédagogiques modernes : études de cas, jeux de rôle, simulations, exercices de communication, pitches oraux, brainstorming collectif.
- Encouragement à la **coopération entre participants** pour favoriser l'apprentissage par l'expérience et la création de réseaux internes au programme.

## 2 Coaching individuel

- Chaque bénéficiaire bénéficiera de **séances de coaching personnalisé** pour travailler sur ses défis spécifiques (confiance, leadership, gestion du stress, prise de décision).
- Suivi des progrès individuels à travers des **fiches de parcours personnel**.
- Ajustement de la démarche en fonction des retours et du niveau d'évolution constaté.

## 3 Conformité pédagogique

- Respect des normes et standards pédagogiques en vigueur.
  - Application de la configuration et du contenu validés par le Maître d'Ouvrage.
  - Remplissage obligatoire, à chaque session :
    - **Feuille de présence signée par les bénéficiaires,**
    - **Fiche d'évaluation de la formation,** renseignée et signée par les participants.
- 

## □ Étape 3 : Évaluation, synthèse et capitalisation

### □ Bilan personnel et évaluation finale

- Élaboration, pour chaque bénéficiaire, d'un **bilan de compétences personnelles** comparant le niveau initial et final.
- Consolidation des résultats individuels dans un tableau de synthèse global.

### 2 Évaluation de la satisfaction

- Analyse des fiches d'évaluation remplies par les bénéficiaires.
- Évaluation des performances pédagogiques et du degré d'atteinte des objectifs du programme.

### 3 Capitalisation et restitution

- Rédaction d'un **rapport de synthèse** détaillant :
  - Le planning et le déroulement des actions ;

- Les bilans de compétences personnelles ;
  - La liste des bénéficiaires formés et coachés ;
  - Les feuilles de présence et fiches d'évaluation signées ;
  - L'analyse des résultats atteints et recommandations.
- Transmission d'une **clé USB** contenant :
    - Les supports pédagogiques,
    - Les photos et vidéos de toutes les sessions,
    - Une **capsule vidéo "Best Of"** retraçant les moments forts par préfecture/province.
- 



### Livrables de la Mission 3

| Type de livrable      | Contenu attendu                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Rapport de synthèse   | Planning validé, déroulement, méthodologie, statistiques, recommandations |
| Bilans de compétences | Bilan personnel de chaque bénéficiaire                                    |
| Feuilles de présence  | Signées et classées par session                                           |
| Fiches d'évaluation   | Remplies et signées par les bénéficiaires                                 |
| Clé USB               | Photos, vidéos, capsule "Best Of" par préfecture/province                 |

## Mission 4 : Renforcement des capacités entrepreneuriales et managériales

### Objectif de la mission

À la suite du développement des soft skills (Mission 3), cette mission vise à doter les porteurs de projets, TPE et startups accompagnés des **connaissances techniques, managériales et entrepreneuriales** nécessaires pour **créer, gérer et développer durablement leurs entreprises**.

Elle consiste à mettre en œuvre un **programme structuré de formation et de coaching** destiné à :

- Affiner et valider les idées de projets ;
- Élaborer et valider les business models (BM) et business plans (BP) ;
- Développer les stratégies de communication, commerciale et financière ;
- Gérer efficacement la phase d'amorçage et de développement ;
- Assurer la **pérennité et la compétitivité** des projets accompagnés.

---

### Méthodologie de mise en œuvre

La méthodologie d'exécution de cette mission s'articule autour de **trois étapes principales**, combinant la formation, le coaching pratique et l'accompagnement à la création ou au développement.

---

#### □ Étape 1 : Diagnostic managérial et planification du programme

##### 1 Diagnostic initial

- Évaluation du niveau de maîtrise des compétences entrepreneuriales de chaque bénéficiaire à travers un **bilan de compétences managériales** (obligatoire pour les 105 participants).
- Identification des besoins différenciés entre **startups** et **TPE/porteurs de projets**, afin d'adapter le rythme, les modules et les outils pédagogiques.

##### 2 Élaboration du programme de formation et de coaching

- Conception d'un **plan d'accompagnement sur mesure**, intégrant les dimensions stratégiques, organisationnelles, commerciales et financières.
- Validation du contenu et du calendrier du cycle de formation par le Maître d'Ouvrage.
- Planification des sessions collectives et des séances de coaching individuel.

## □ Étape 2 : Mise en œuvre du programme de renforcement des capacités

Le programme combinera des **sessions de formation en présentiel**, des **ateliers de co-crédation**, et des **coaching pratiques**, couvrant au minimum les thématiques exigées par le CPS.

### ▣ Contenu des formations et coachings

Le plan de formation couvrira les thématiques suivantes :

| Domaine d'intervention                                   | Sous-thèmes                                                                                                                                                                                                                            | Objectifs pédagogiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A-Conception et structuration de l'idée de projet</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Design Thinking et innovation</li> <li>• Analyse de l'environnement</li> <li>• Veille concurrentielle</li> <li>• Étude de marché</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stimuler la créativité et l'innovation dans la conception de projets.</li> <li>- Identifier les besoins réels du marché et les opportunités.</li> <li>- Analyser l'environnement externe et la concurrence.</li> <li>- Affiner et valider l'idée du projet à fort potentiel.</li> </ul> |
| <b>B-Structuration juridique et stratégique</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formes juridiques adaptées aux entités à créer</li> <li>• Droit commercial et droit des affaires</li> <li>• Incitations de l'État pour la création et le développement des projets</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aider les bénéficiaires à choisir le statut juridique adéquat.</li> <li>- Comprendre les obligations légales et contractuelles.</li> <li>- Exploiter les programmes d'incitation et dispositifs publics de soutien aux TPME et startups.</li> </ul>                                     |
| <b>C-Gestion financière et administrative</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestion comptable et financière</li> <li>• Fiscalité</li> <li>• Modes et programmes de financement dédiés à la TPME et aux startups</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renforcer les compétences en gestion et comptabilité.</li> <li>- Comprendre les bases de la fiscalité des entreprises.</li> <li>- Identifier et accéder aux mécanismes de financement disponibles.</li> </ul>                                                                           |
| <b>D-Développement commercial et communication</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prospection commerciale</li> <li>• Marketing et communication (focus digital)</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquérir les techniques de vente et de prospection.</li> <li>- Élaborer une stratégie marketing adaptée au marché cible.</li> </ul>                                                                                                                                                     |

| Domaine d'intervention                           | Sous-thèmes                                                                                     | Objectifs pédagogiques                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                 | - Utiliser efficacement les outils numériques pour la promotion et la visibilité.                                                                                                                                                                                    |
| E- Management et gestion des ressources humaines | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des ressources humaines et leadership</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renforcer les compétences managériales et de leadership.</li> <li>- Organiser efficacement les équipes et les tâches.</li> <li>- Développer une culture de performance et de motivation au sein des entreprises.</li> </ul> |

## 2 Méthodologie pédagogique

- **Apprentissage actif** : alternance entre apports théoriques, travaux pratiques, simulations et études de cas réels.
- **Ateliers de co-construction** : élaboration de BM et BP personnalisés.
- **Coaching thématique** : accompagnement individuel sur les points critiques (finance, gestion, marketing, RH).
- **Sessions de pitch** : préparation et entraînement à la présentation orale des projets devant partenaires, investisseurs et institutions.
- Utilisation d'outils modernes (Business Model Canvas, Lean Canvas, SWOT, matrice PESTEL...).

## 3 Suivi de l'assiduité et de la qualité

- Respect du **planning validé** par le Maître d'Ouvrage.
- Contrôle de la présence à chaque session via **feuilles de présence signées**.
- Évaluation continue de la satisfaction à travers **fiches d'évaluation** renseignées par les bénéficiaires.

## □ Étape 3 : Évaluation, validation et capitalisation

### □ Bilans de compétences managériales

- Établissement, pour chaque bénéficiaire, d'un **bilan managérial final** retraçant les acquis, les progrès réalisés et les axes de perfectionnement.
- Comparaison avec le diagnostic initial pour mesurer les impacts de la formation.

## 2 État des créations juridiques

- Accompagnement des bénéficiaires dans le **choix et la formalisation du statut juridique** (auto-entrepreneur, société, coopérative, startup, etc.).
- Suivi et compilation des **justificatifs de création** pour les nouvelles entités formées.

## 3 Restitution et capitalisation

- Rédaction du **rapport de synthèse** de la mission, intégrant :
  - Le déroulement du programme et les modules réalisés ;
  - La liste complète des bénéficiaires formés et coachés ;
  - Les bilans de compétences managériales ;
  - Les fiches d'évaluation et feuilles de présence ;
  - L'état des créations juridiques avec preuves à l'appui.
- Transmission d'une **clé USB** contenant :
  - Les supports de formation,
  - Les photos et vidéos des sessions,
  - Une **capsule vidéo "Best Of"** par préfecture/province.

### Livrables de la Mission 4

| Type de livrable                   | Contenu attendu                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rapport de synthèse                | Déroulement complet, méthodologie, modules, statistiques et recommandations |
| Liste des bénéficiaires            | Liste nominative et répartition par préfecture/province                     |
| Bilans de compétences managériales | Pour les 105 bénéficiaires (startups et TPE/porteurs de projets)            |
| Feuilles de présence               | Signées par les bénéficiaires pour chaque session                           |
| Fiches d'évaluation                | Remplies et signées par les bénéficiaires                                   |
| État des créations juridiques      | Justificatifs légaux selon le statut choisi                                 |
| Clé USB                            | Supports, photos, vidéos et capsule "Best Of" par préfecture/province       |

---

## Mission 5 : Accompagnement pour l'amorçage et la pérennisation des activités

### Objectif de la mission

La **Mission 5** constitue la **phase finale et la plus déterminante** du programme **ABRID INCUB**, car elle vise à **assurer la concrétisation et la durabilité** des projets accompagnés.

Elle a pour but de :

- Accompagner les bénéficiaires dans la **mise en œuvre effective** de leurs activités ;
- Garantir la **pérennisation économique, technique et organisationnelle** de leurs entreprises ;
- Faciliter leur **intégration dans les réseaux économiques et d'affaires** ;
- Favoriser leur **accès au financement, aux marchés et à la commande publique**.

Cette mission s'articule autour de **trois étapes complémentaires** :

1. L'accompagnement et l'aide à la pérennisation,
2. Le réseautage professionnel,
3. Les rencontres de financement.

---

### Méthodologie de mise en œuvre

#### □ Étape 1 : Accompagnement et aide à la pérennisation

##### ▣ Assistance au démarrage des activités

- Appui aux bénéficiaires pour l'obtention de toutes les **autorisations administratives et réglementaires** nécessaires au lancement de leurs activités (registre du commerce, patente, autorisations sectorielles, etc.) ;
- Assistance technique de proximité pour la **mise en œuvre opérationnelle** des projets et la **résolution des difficultés de démarrage** (fournisseurs, clients, outils de gestion, partenariats, etc.).

##### ▣ Élaboration et validation des plans d'aide à la pérennisation

- Accompagnement personnalisé de chaque bénéficiaire pour la **préparation, la rédaction et la validation** de son plan d'aide à la pérennisation ;

- Ce plan précisera les actions prioritaires à mettre en œuvre, les partenaires à mobiliser, les objectifs commerciaux et les indicateurs de performance à suivre.

### 3 Accompagnement individuel de proximité (120 jours)

- Chaque bénéficiaire bénéficiera d'un **suivi individualisé** sur une période de **120 jours**, comprenant des visites terrain, des séances de conseil et d'assistance à distance ;
- Suivi de la performance économique et commerciale (CA, clients, production, communication, etc.) ;
- Accompagnement à l'adaptation du modèle économique selon les résultats observés.

### 4 Formation pratique : accès aux marchés et appels d'offres

- Organisation d'une **formation-action** sur la **soumission aux appels d'offres** et l'accès à la commande publique :
  - Rédaction des dossiers standards (technique, administratif, financier) ;
  - Compréhension du processus de passation ;
  - Exercices de simulation de soumission et de réponse à un AO réel.
- Élaboration de **supports de formation** dédiés à cette thématique, validés par le Maître d'Ouvrage.

### 5 Mise en place d'outils de gestion et de suivi

- Chaque bénéficiaire sera doté d'un **tableau de bord de gestion** et d'un **kit digital** comprenant des modèles de fiches pratiques :
  - Suivi de trésorerie, gestion des stocks, clients, fournisseurs, commandes, plan de communication, etc.
- Formation à l'utilisation de ces outils pour un suivi régulier et autonome des activités.



## 6 Suivi mensuel et reporting

- Élaboration d'un **état d'avancement mensuel** par projet, présentant les réalisations du mois, les difficultés rencontrées, le plan d'action suivant et les indicateurs de performance (CA, ventes, partenariats).
- Modèle d'état d'avancement validé avec le Maître d'Ouvrage avant lancement.

### ◆ Livrables de l'étape 1 :

- État des autorisations obtenues par les bénéficiaires ;
- Plans d'aide à la pérennisation individuels ;
- Rapport d'assistance retraçant toutes les actions d'appui menées ;
- Support de formation "Soumission aux appels d'offres" ;
- Dossiers standards d'appel d'offres par bénéficiaire ;
- Tableaux de bord renseignés et fiches de gestion d'entreprise ;
- États mensuels d'avancement par bénéficiaire ;
- Clé USB contenant photos, vidéos et **capsule "Best Of"** par préfecture/province.

## □ Étape 2 : Réseautage et intégration dans l'écosystème

### □ Organisation des activités de réseautage

- Mise en œuvre d'un **programme de réseautage professionnel** à raison d'au moins **une action par mois** sur les 6 mois d'exécution, soit un minimum de **six (06) activités** :
  - Rencontres **B2B** entre startups, TPE et grandes entreprises (GE) ;
  - Rencontres avec les **chambres professionnelles, clusters, confédérations** et partenaires institutionnels ;
  - Réunions avec les **responsables achats et approvisionnement** des grandes structures partenaires du programme ABRID ;
  - **Visites d'échange, forums et workshops** thématiques par filière ou secteur.

### □ Méthodologie de mise en œuvre

- Mobilisation de l'ensemble de l'écosystème régional et national pour favoriser l'accès aux réseaux d'affaires et aux marchés ;
- Coordination avec le Maître d'Ouvrage pour la validation des thèmes et lieux des événements ;
- Organisation logistique complète (salles, invitations, visibilité, reportage photo/vidéo).

## 1. Suivi et capitalisation

- Tenue d'un **registre des structures participantes** et des contacts utiles (TPME, startups, GE, institutions, clusters, etc.) ;
- Suivi des résultats obtenus (RDV B2B, partenariats signés, bons de commande, collaborations établies) ;
- Évaluation de la satisfaction des participants.

### ◆ Livrables de l'étape 2 :

- Bilan détaillé des actions de réseautage ;
- Liste des structures visitées ou invitées ;
- Listes de présence signées ;
- Résultats des rencontres (contrats, commandes, partenariats) ;
- Clé USB contenant photos, vidéos et **capsule "Best Of"** par préfecture/province.

## 2. Étape 3 : Rencontres de financement

### 1. Organisation des journées de financement

- Organisation de **rencontres dédiées au financement**, réunissant :
  - Banques, institutions de microfinance, bailleurs de fonds, programmes d'appui (INDH, Maroc PME, Tamwilcom, etc.), business angels et investisseurs privés.
- Présentation des **projets éligibles au financement ou à l'investissement**.

### 2. Préparation et documentation

- Préparation d'un **dossier complet pour chaque bénéficiaire**, comprenant :
  - Fiche technique du projet ;
  - Présentation du parcours d'accompagnement ;
  - Réalisations (CA, emplois créés, partenariats, plans d'action) ;
  - État d'avancement et besoins en financement.
- Constitution d'un **recueil papier et électronique** des programmes de financement disponibles (conditions, procédures, contacts).

### 3. Déroulement et suivi post-rencontres

- Organisation logistique et animation des journées de financement ;
- Suivi des projets ayant décroché des RDV, financements, ou partenariats post-programme ;

- Élaboration du **bilan final de la mission** retraçant tous les résultats et impacts atteints.

◆ *Livrables de l'étape 3 :*

- Rapport de synthèse final du programme ABRID INCUB ;
- Recueil complet des moyens et programmes de financement disponibles ;
- Bilan des rencontres de financement (levées de fonds, partenariats conclus) ;
- Fiches techniques et présentations par bénéficiaire ;
- Présentation-bilan par candidat (situation initiale, plan d'action, réalisations, partenariats obtenus) ;
- Clé USB contenant toutes les photos, vidéos et **capsule "Best Of"** par préfecture/province.

#### 4. Outils de pilotage et de suivi

Le dispositif de pilotage et de suivi mis en place par **ABI Consulting** vise à garantir :

- Une **coordination efficace** entre le Maître d'Ouvrage, notre bureau d'étude et les partenaires régionaux ;
- Une **maîtrise de l'avancement** des différentes missions ;
- Une **traçabilité complète** des actions et livrables ;
- Une **évaluation continue des performances** du programme et des bénéficiaires.

L'approche retenue repose sur un **système intégré de gestion de projet**, combinant outils numériques, reporting régulier et suivi participatif.

##### 4.1. Structure du dispositif de pilotage

Le pilotage du programme s'organisera à trois niveaux complémentaires :

| Niveau                       | Rôle principal                                                        | Acteurs impliqués                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1 Niveau stratégique</b>  | Validation des orientations et décisions majeures                     | CRI-SM, Comité de suivi, Chef de projet ABI Consulting         |
| <b>2 Niveau opérationnel</b> | Planification, coordination et supervision des activités quotidiennes | Chef de projet, coordinateur régional, responsables de mission |
| <b>3 Niveau terrain</b>      | Mise en œuvre des actions, collecte des données et reporting          | Formateurs, coaches, assistants logistiques, bénéficiaires     |

##### 4.2. Principaux outils de pilotage et de suivi

Le prestataire mettra en œuvre un **ensemble d'outils standards et numériques** assurant un suivi rigoureux, transparent et documenté du programme.

| Outil de suivi                                   | Description et utilisation                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Planning général d'exécution (type Gantt)</b> | Outil de planification dynamique permettant de visualiser le déroulement des 5 missions, les jalons, les dépendances et les échéances clés.                            |
| <b>Tableau de bord de suivi du programme</b>     | Regroupe les indicateurs de performance (taux d'avancement, nombre de bénéficiaires formés, état des livrables, actions réalisées, retards). Mis à jour mensuellement. |

| Outil de suivi                                               | Description et utilisation                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fiches de suivi de mission</b>                            | Fiches normalisées utilisées pour chaque activité (formation, coaching, visite, accompagnement). Elles précisent : lieu, date, participants, objectifs, livrables et observations. |
| <b>Rapports périodiques d'avancement</b>                     | Rapports mensuels et intermédiaires synthétisant les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les mesures correctives envisagées.                                          |
| <b>Grilles de performance des bénéficiaires</b>              | Grilles individuelles permettant de suivre l'évolution de chaque participant selon des critères : compétences acquises, performance économique, niveau d'autonomie.                |
| <b>Feuilles de présence et fiches d'évaluation</b>           | Outils de traçabilité signés par les bénéficiaires pour toutes les activités de formation et de coaching.                                                                          |
| <b>Base documentaire numérique (cloud partagé / clé USB)</b> | Regroupe tous les documents, rapports, photos, vidéos et livrables validés. Elle facilite la centralisation et la capitalisation des informations.                                 |
| <b>Indicateurs SMART de suivi-évaluation</b>                 | Indicateurs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, définis pour évaluer la progression du programme et l'impact auprès des bénéficiaires.                  |
| <b>Réunions de coordination et comptes rendus</b>            | Réunions périodiques avec le CRI-SM pour ajuster les plannings, valider les livrables et synchroniser les actions terrain.                                                         |

#### 4.3. Proposition des indicateurs de performance

| Domaine                           | Indicateur clé (KPI)                                             | Source de vérification                  | Fréquence        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Cadrage</b>                    | Note de cadrage validée dans les délais                          | PV de validation du CRI-SM              | Unique           |
| <b>Information &amp; sourcing</b> | Nombre total de candidatures reçues / retenues                   | Rapport Mission 2                       | Fin de Mission 2 |
| <b>Soft skills</b>                | % de bénéficiaires ayant amélioré leurs compétences personnelles | Bilans personnels & fiches d'évaluation | Fin de Mission 3 |

| Domaine                       | Indicateur clé (KPI)                                           | Source de vérification                                   | Fréquence        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| Formation entrepreneuriale    | Nombre de modules dispensés / taux de participation            | Feuilles de présence                                     | Par session      |
| Accompagnement post-crédation | % de bénéficiaires disposant d'un plan de pérennisation validé | Plans individuels validés                                | Mensuel          |
| Réseautage & financement      | Nombre de partenariats ou contrats conclus                     | Bilans d'actions de réseautage / rapports de financement | Fin de Mission 5 |

#### 4.4. Suivi-évaluation et capitalisation

Le dispositif de **suivi-évaluation (S&E)** permettra de :

- Mesurer le **degré d'atteinte des objectifs** du programme ;
- Identifier les **facteurs de réussite et les difficultés rencontrées** ;
- Produire des **données probantes** pour l'amélioration continue du dispositif.

**Outils complémentaires de capitalisation :**

- **Rapports de mission consolidés** (intermédiaires et finaux) ;
- **Capsules vidéo "Best Of"** retraçant les réalisations par province ;
- **Fiches de success stories** mettant en avant les bénéficiaires les plus performants ;
- **Guide interne de capitalisation** compilant les leçons apprises et bonnes pratiques pour de futurs programmes d'incubation.

#### 4.5. Communication et reporting avec le Maître d'Ouvrage

- **Réunions de coordination mensuelles** entre l'équipe projet et le CRI-SM pour présenter les rapports d'avancement.
- **Validation systématique des livrables** avant passage à la phase suivante.
- **Canaux de communication** : e-mail professionnel, plateforme collaborative partagée, et contacts téléphoniques dédiés.
- **Reporting final** : un rapport global retraçant l'ensemble du programme, les résultats obtenus, les indicateurs atteints et les recommandations stratégiques pour la continuité du dispositif ABRID INCUB.

## 5. Moyens matériels et Logistique

La mise en place d'une logistique performante vise à **garantir le bon déroulement opérationnel** de l'ensemble des activités du programme **ABRID INCUB**, en assurant :

- Des conditions optimales d'organisation et d'apprentissage pour les bénéficiaires
- La fluidité de la coordination entre les acteurs du projet
- La qualité technique, matérielle et visuelle des formations, coachings, ateliers et événements.

### 5.1. Dispositif logistique général

Notre bureau mettra en place un **dispositif logistique complet**, couvrant l'ensemble des besoins liés à la réalisation des missions du programme.

| Catégorie                                                                                                                      | Description du dispositif prévu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Coordination et administration</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bureau de coordination opérationnelle installé à Agadir, siège de la région Souss Massa.</li> <li>• Moyens de communication modernes (téléphones, ordinateurs portables, imprimantes, scanner, connexion haut débit).</li> <li>• Plateforme numérique interne pour le partage de documents et le suivi du planning (Google Workspace / Notion / SharePoint).</li> </ul>      |
|  <b>Salles et lieux d'exécution</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salles adaptées pour la formation, le coaching et les rencontres, équipées et accessibles dans les 6 préfectures et provinces (Agadir Ida Outanane, Inezgane Aït Melloul, Chtouka Aït Baha, Taroudant, Tiznit, Tata).</li> <li>• Espaces lumineux, aérés et sécurisés, avec possibilité de configuration en mode atelier ou conférence.</li> </ul>                           |
|  <b>Matériel pédagogique et audiovisuel</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinateurs portables et vidéoprojecteurs pour les sessions de formation.</li> <li>• Tableau magnétique, paperboard, imprimante portable, sonorisation légère et micro.</li> <li>• Écrans de projection, rallonges électriques et supports muraux.</li> <li>• Appareils photo/vidéo pour la documentation des activités et la réalisation des capsules "Best Of".</li> </ul> |

| Catégorie                                                                                                                       | Description du dispositif prévu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Supports de formation et documentation</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Production et impression de tous les supports pédagogiques : manuels, fiches, présentations PowerPoint, tests d'évaluation.</li> <li>• Création de supports numériques (clé USB, QR code, cloud partagé) pour une diffusion simplifiée.</li> <li>• Traduction des supports en arabe ou français selon les besoins des bénéficiaires.</li> </ul> |
|  <b>Logistique de déplacement</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à disposition de véhicules pour le transport des formateurs, coachs et matériels vers les différents sites d'intervention.</li> <li>• Prise en charge du transport des bénéficiaires lors des visites d'échange et des événements de réseautage (forums, kick-off, workshops).</li> </ul>                                                  |
|  <b>Logistique d'accueil et de confort</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à disposition de pauses-café et déjeuners légers lors des formations et rencontres officielles.</li> <li>• Kit d'accueil pour les participants (bloc-notes, stylos, badges, dossiers).</li> </ul>                                                                                                                                          |
|  <b>Communication et visibilité</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Création d'une identité visuelle du programme (bannière, roll-up, affiches, fonds de scène).</li> <li>• Captation photo/vidéo de toutes les sessions et événements.</li> <li>• Production de <b>capsules vidéos "Best Of"</b> par préfecture et province.</li> </ul>                                                                            |
|  <b>Documentation et archivage</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centralisation de tous les documents (feuilles de présence, rapports, évaluations, supports, photos, vidéos) dans une base de données numérique.</li> <li>• Livraison des documents finaux sur <b>clé USB</b> et <b>cloud sécurisé</b> au CRI Souss Massa.</li> </ul>                                                                           |

## 5.2. Logistique spécifique par type d'activité



| Type d'activité                           | Exigences logistiques spécifiques                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formations et ateliers</b>             | Salles de 25 à 35 places, disposées en mode U ou atelier. Équipement audiovisuel complet. Présence d'un assistant logistique pour chaque session.              |
| <b>Sessions de coaching individuel</b>    | Espace calme et confidentiel, aménagé pour entretiens individuels. Matériel de communication (ordinateur, micro, tableau, connexion internet).                 |
| <b>Visites et échanges de terrain</b>     | Organisation des déplacements, autorisations locales, documents de présentation et fiches de visite.                                                           |
| <b>Rencontres B2B, forums et kick-off</b> | Lieux spacieux et accessibles. Podium, sonorisation, signalétique et supports de communication. Photographe et caméraman professionnels.                       |
| <b>Rencontres de financement</b>          | Espace de présentation équipé de projecteurs, écrans, micros et pupitre. Préparation de dossiers de présentation papier et numérique pour chaque bénéficiaire. |

## 6. Moyens Humains – équipe de projet

### Chef de projet

| Nom et Prénom    | Fonction dans le projet          | Formation / Diplôme                                                                                                                                                                                                                                 | Expérience pertinente                                                                                                                                                                                                                 | Compétences clés / Domaines d'expertise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rôle dans la mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ahmed BEN HAMMOU | Chef de projet / Chef de mission | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Master of Science, Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (2015) – <i>Chaînes de valeur et agro-logistique</i></li> <li>• Diplôme d'ingénieur d'État en Agronomie, ENA Meknès (2012)</li> </ul> | <p><b>13 ans d'expérience</b> dans la gestion de projets de développement, entrepreneuriat, accompagnement d'entreprises, incubation et finance inclusive.</p> <p>Expériences clés : FAO, FIDA, Enabel, OIT, GIZ, ABI Consulting.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Management et pilotage de programmes d'incubation et d'accompagnement.</li> <li>• Suivi &amp; évaluation axé sur les résultats (GAR / SYGRI).</li> <li>• Montage de projets d'investissement et financement des TPME.</li> <li>• Appui à la création et gestion des coopératives / startups.</li> <li>• Leadership, planification, communication institutionnelle.</li> <li>• Bonne connaissance du contexte entrepreneurial de la région Souss Massa.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervision technique et méthodologique de l'ensemble des missions du programme ABRID INCUB.</li> <li>• Coordination de l'équipe projet et interlocuteur principal du CRI Souss Massa.</li> <li>• Validation des livrables et contrôle qualité.</li> <li>• Animation des réunions de pilotage et capitalisation des résultats.</li> </ul> |

### Formateurs / Experts en entrepreneuriat et accompagnement

| Nom et Prénom            | Fonction dans le projet                            | Formation / Diplôme                                                                                                                         | Expérience pertinente                                                                                                                                             | Domaines d'expertise                                                                                                | Rôle dans la mission                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Redouane MOUBARIK</b> | Formateur en marketing digital et e-commerce       | Doctorat en Sciences de Gestion – FSJES Marrakech (Publicité digitale) Master en Marketing et Management commercial – Université Cadi Ayyad | 12 ans d'expérience dans la formation, l'enseignement et le conseil en marketing et entrepreneuriat digital (ONCA, OIT, Enabel, CRI, NEF).                        | Marketing digital, communication, e-commerce, community management, branding, plan de communication, business plan. | Anime les formations sur le <b>marketing digital, branding et commercialisation</b> des produits et services.               |
| <b>Noura EL FARISSI</b>  | Formatrice en entrepreneuriat et gestion de projet | Doctorante en Management de Projet – ENCG Agadir Diplôme ENCG Agadir (Gestion financière et comptable) PMP® certifiée – PMI                 | 6 ans d'expérience dans l'accompagnement entrepreneurial, l'enseignement supérieur et la gestion de projets (Réseau Entreprendre Maroc, ENCG, 1000 Fikra Afrika). | Management de projet agile, business model, innovation, entrepreneuriat, leadership, soft skills, accompagnement.   | Anime les modules sur le <b>management de projet, l'agilité, l'entrepreneuriat et la structuration des business models.</b> |
| <b>Hanan AFARIAD</b>     | Formatrice en entrepreneuriat social et vert       | Master en ingénierie des programmes de développement socio-économique – Univ.                                                               | 15 ans d'expérience en ingénierie de développement, entrepreneuriat social, et                                                                                    | Entrepreneuriat social et vert, innovation, suivi-évaluation, business plan,                                        | Anime les modules sur <b>l'entrepreneuriat vert, l'innovation sociale, le</b>                                               |

| Nom et Prénom                | Fonction dans le projet                                 | Formation / Diplôme                                                                                              | Expérience pertinente                                                                                                                          | Domaines d'expertise                                                                                             | Rôle dans la mission                                                                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                         | Hassan II Licence en gestion – Univ. Cadi Ayyad                                                                  | suivi-évaluation (MCISE, GIZ, OIT, ADS).                                                                                                       | gestion de projet, soft skills entrepreneuriales.                                                                | <b>développement durable et la gestion de projet.</b>                                                                 |
| <b>Hassania ANTER</b>        | Experte formatrice en entrepreneuriat féminin et genre  | Master spécialisé en Genre et Politiques Publiques – Univ. Mohamed V Rabat<br>Certifiée BIT (GERME/Get Ahead)    | 15 ans d'expérience dans les projets de développement, l'entrepreneuriat féminin et la formation sensible au genre (ENABEL, PNUD, ORMVA, GIZ). | Genre et entrepreneuriat, leadership féminin, empowerment, gestion de projet sensible au genre, communication.   | Anime les formations sur <b>le leadership, la communication, la planification et l'entrepreneuriat féminin.</b>       |
| <b>Ezzaytouniya MAKSSOUD</b> | Formatrice en entrepreneuriat et accompagnement des TPE | Master ENCG (Management et Conseil en Entreprise) Master Recherche – FSJES Marrakech (Économie et environnement) | 18 ans d'expérience dans la formation, l'incubation et l'accompagnement entrepreneurial (GIZ, OIT, CRI, INDH, CIPE).                           | Création d'entreprise, business plan, financement, gestion, fiscalité, marketing, accompagnement post-crédation. | Intervient dans les formations sur <b>la gestion entrepreneuriale, la création et le financement des entreprises.</b> |

### Coachs en Soft Skills et Développement Personnel

| Nom et Prénom                     | Fonction dans le projet                                 | Formation / Diplôme                                                                                                                                                                                                                                      | Expérience pertinente                                                                                                                                                                                                      | Domaines d'expertise                                                                                                                                     | Rôle dans la mission                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mohamed Essafi EL OUARZAZI</b> | Coach en développement personnel et entrepreneuriat     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Master en Management des Ressources Humaines – ENCG Settat</li> <li>• Diplôme en Audit &amp; Contrôle de Gestion – ENCG Settat</li> </ul>                                                                       | 20 ans d'expérience dans l'accompagnement entrepreneurial, la conduite du changement et la formation managériale. Interventions : FORSA, CARE International, Technopark, Enactus, Orange Corners, Jadara Foundation, ONEE. | Développement personnel, leadership, communication interpersonnelle, gestion du changement, accompagnement entrepreneurial.                              | Anime les <b>ateliers de leadership, communication, confiance en soi et intelligence émotionnelle</b> . Appuie les bénéficiaires dans la <b>gestion de projet et la motivation individuelle</b> .  |
| <b>Sidi Mohammed ZAHID</b>        | Coach psychologue clinicien et formateur en soft skills | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Master en Psychologie Clinique de la Santé – Univ. Ibn Tofail Kénitra</li> <li>• Master en Management des Ressources Humaines – ENCG Settat</li> <li>• Certifié Formateur BIT et Coach Professionnel</li> </ul> | 20 ans d'expérience dans la <b>psychologie appliquée</b> , la formation et l'accompagnement des jeunes, femmes et entrepreneurs. Interventions : INDH, ADA, ANAPEC, OFPPT, Fondation Zniber, MCISE, AMSED.                 | Soft skills, intelligence émotionnelle, gestion du stress et des conflits, communication bienveillante, psychologie du travail, développement personnel. | Anime les <b>sessions de développement personnel, la gestion du stress, la prise de parole</b> , et accompagne les porteurs de projets pour renforcer leur <b>résilience et confiance en soi</b> . |
| <b>Aziz SLIMANI</b>               | Coach professionnel certifié (ICF)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coach professionnel certifié ACC – International Coach Federation (ICF)</li> </ul>                                                                                                                              | 18 ans d'expérience dans le <b>coaching individuel et collectif</b> , la formation en entrepreneuriat et le développement des compétences. Expériences : Al                                                                | Coaching professionnel, leadership, communication, négociation,                                                                                          | Anime les <b>ateliers de coaching collectif, les bilans personnels</b> , et accompagne les bénéficiaires dans la <b>planification, la gestion du</b>                                               |

| Nom et Prénom | Fonction dans le projet | Formation / Diplôme                                                                                                                                                                              | Expérience pertinente                                               | Domaines d'expertise                                                | Rôle dans la mission                  |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|               |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>MBA en Administration des entreprises – IAE Amiens / Université de Fès</li> <li>Licence professionnelle en Management Logistique et Commercial</li> </ul> | Amana Microfinance, ENABEL, APEFE, CAPE Meknès, MIN AJLIKI, ANAPEC. | planification, accompagnement entrepreneurial, gestion des équipes. | <b>temps et la prise de décision.</b> |

### Équipe de communication

| Nom et Prénom            | Fonction dans le projet                             | Formation / Diplôme                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Expérience pertinente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Domaines d'expertise                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rôle dans la mission                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jihane MAHI</b>       | Designer Web /<br>Experte en communication visuelle | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mastère spécialisé en Marketing &amp; Communication – ISCAE Rabat (2023)</li> <li>• Licence en Communication &amp; Management Événementiel – ENCG Kénitra (2022)</li> <li>• Diplôme en Infographie – Collège Lasalle International Rabat (2009)</li> </ul> | 15 ans d'expérience dans le design graphique, le branding et la communication digitale. Fondatrice de <b>CREAJI Agency</b> , spécialisée dans la conception d'identités visuelles et de stratégies de marque pour entreprises et institutions. Interventions : Maroc PME, Ambassade du Maroc, Arcom Sup, Flow Motion School, CDG, UIR. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brand design, charte graphique, communication digitale et multimédia.</li> <li>• Création de supports visuels print et web (brochures, affiches, bannières, visuels réseaux sociaux).</li> <li>• Stratégie de marque, storytelling visuel et web design.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conçoit et décline <b>l'identité visuelle du programme ABRID INCUB.</b></li> <li>• Réalise les <b>supports digitaux et imprimés.</b></li> <li>• Appuie la communication visuelle et la mise en page des rapports, présentations et capsules.</li> </ul> |
| <b>Rabie EL OUERRADI</b> | Photographe /<br>Vidéaste                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diplôme de Technicien en Audiovisuel – Montage Vidéo (ESIMAV Meknès, 2012)</li> <li>• Formations professionnelles : AL JAZEERA (Montage &amp; Vision créative), ARRI</li> </ul>                                                                            | 13 ans d'expérience dans la production audiovisuelle, le tournage et le montage vidéo. Caméraman pigiste à la <b>Maghreb Arabe Presse (MAP)</b> et réalisateur pour <b>Maghreb Broadcasting Services (MBS)</b> . Expérience sur des projets                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Captation et montage vidéo professionnel.</li> <li>• Réalisation de films institutionnels et capsules documentaires.</li> <li>• Photographie événementielle et couverture audiovisuelle.</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assure la <b>captation photo/vidéo</b> de toutes les activités du programme.</li> <li>• Réalise les <b>capsules "Best Of"</b> par préfecture et province. • Gère le <b>montage, l'étalonnage et</b></li> </ul>                                          |

| Nom et Prénom | Fonction dans le projet | Formation / Diplôme                      | Expérience pertinente                                                                                       | Domaines d'expertise | Rôle dans la mission                   |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
|               |                         | (Éclairage cinéma), CCM (Final Cut Pro). | nationaux et internationaux : SIAM Meknès, Banque Mondiale, BEIN Sports, Rotary International, MCA Morocco. |                      | la livraison des supports multimédias. |



## 7. Organisation du projet

L'organisation proposée par **ABI Consulting** vise à assurer :


- Une **gestion rigoureuse** du programme ABRID INCUB,
- Une **coordination fluide** entre les différents intervenants,
- Une **mobilisation efficace des ressources humaines et techniques** nécessaires à la réussite de l'ensemble des cinq missions.

Cette organisation repose sur un **dispositif pyramidal** combinant :

- Un **pilotage stratégique et technique** assuré par le chef de mission,
- Une **coordination opérationnelle** gérée par le coordinateur régional,
- Des **équipes spécialisées** (formateurs, coaches, experts sectoriels et personnel logistique).

### 7.1. Schéma de pilotage du projet

Voici la structure organisationnelle prévue pour la mise en œuvre du programme :

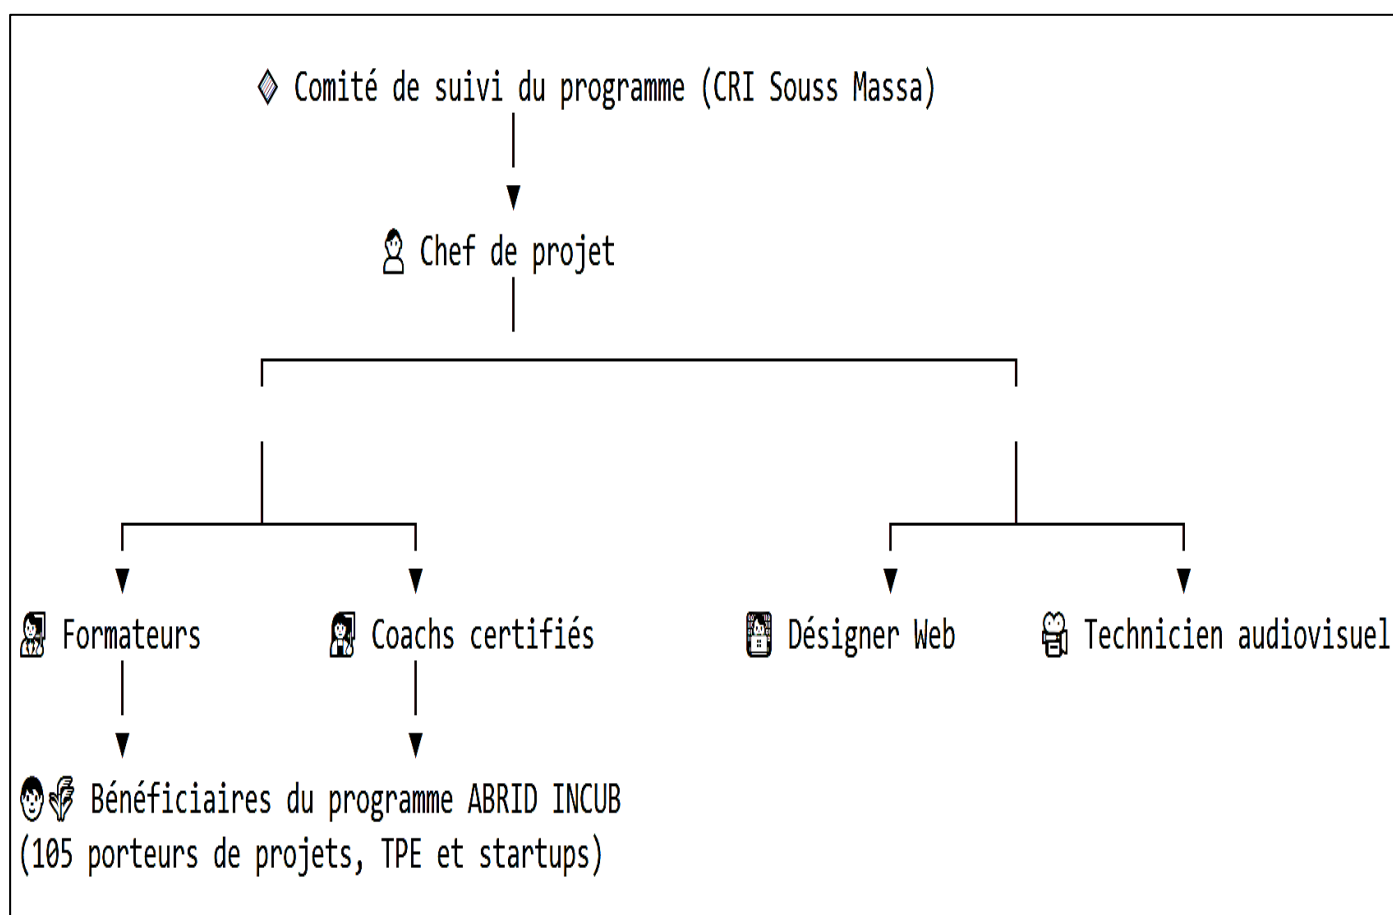

## 7.2. Composition et rôle de l'équipe projet

| Profil                                                        | Rôle et responsabilités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chef de projet</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assure la direction globale du programme et la supervision technique des cinq missions.</li> <li>Interlocuteur principal du Maître d'Ouvrage.</li> <li>Garantit la qualité, les délais et la conformité des livrables.</li> <li>Anime les réunions de pilotage et coordonne les validations.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Experts thématiques / Formateurs</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Animent les modules de formation entrepreneuriale et managériale (design thinking, gestion financière, RH, fiscalité, marketing, communication digitale, etc.).</li> <li>Adaptent le contenu selon les profils des bénéficiaires.</li> <li>Évaluent les compétences acquises à chaque session.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Coach(e)s certifié(e)s en développement personnel</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mènent les ateliers de soft skills : confiance en soi, communication bienveillante, leadership, gestion du stress, etc.</li> <li>Réalisent les bilans personnels et accompagnent les bénéficiaires dans leur progression individuelle.</li> <li>Participent au suivi de la motivation et de la cohésion de groupe.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Expert en financement et accompagnement post-crédation</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuie les bénéficiaires pour la préparation de leurs dossiers de financement et de soumission aux appels d'offres.</li> <li>Anime les journées de financement et les rencontres B2B.</li> <li>Assure le lien avec les institutions financières et bailleurs.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Designer Web</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assure la <b>conception visuelle et la valorisation digitale</b> du programme ABRID INCUB.</li> <li>Conçoit l'<b>identité graphique</b> du projet (logo, chartes, supports imprimés et digitaux), réalise les <b>visuels web et réseaux sociaux</b>, participe à la <b>mise en forme des rapports et présentations</b></li> <li>Crée les <b>interfaces web</b> nécessaires à la communication du programme, et collabore étroitement avec l'équipe audiovisuelle pour garantir la <b>cohérence et la qualité de l'image</b> du programme.</li> </ul> |
| <b>Technicien audiovisuel</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assure la captation photo/vidéo des activités, la réalisation des capsules "Best Of" et l'archivage numérique.</li> <li>Appuie les sessions nécessitant des présentations audiovisuelles.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 8. Planning de la mission

[illegible]

[illegible]

