

Pour le compte de :



Note méthodologique

AO N° 27/II/2025/ONSSA/DRMASA

**ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MISE A NIVEAU DES PEPINIERES
SUR LE PLAN PHYTOSANITAIRE POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION
REGIONALE DE LL'ONSSA , Région de MARRAKECH SAFI , LOT UNIQUE**

Réalisée par :



ABI CONSULTING
N° 33 IMM F RESIDENCE AL AWAILE ANGLE
AV HASSAN II ET BD GHAZZA TEMARA
ICE : 002573010000023 Tél : +212 6 61 39 64 13
Abmed Ben Hammou : Gérant



Plan



- A propos de ABI consulting ;
- COMPRÉHENSION DES PRESTATIONS;
- Approche méthodologique ;
- Livrables;
- Personnel ;
- Coordination de la mission
- Planning de la mission ;

A PROPOS DE ABI CONSULTING



PRÉSENTATION DE NOTRE CABINET

○ ABI Consulting SARL

ABI Consulting est un cabinet de conseil présent au Maroc et qui intervient en appui de projets de développement d'acteurs publics, d'organismes de la coopération internationale et d'organisations de la société civile.

- Élaboration des plans M&E et apprentissage
- Élaboration des outils de collecte de données
- Réalisation présentielle ou virtuelle d'enquêtes M&E et de tracer studies
- Traitement et analyse des données en utilisant des logiciels appropriés
- Évaluation finale et à mi-parcours des projets de développement
- Formation et Conseil aux projets
- Capitalisation et gestion des connaissances

Suivi-évaluation et capitalisation

- Accompagnement pré-crédation des porteurs de projet (renforcement du profil entrepreneurial, identification d'idées d'affaires, élaboration des business plans, etc)
- Appui à la création des TPME
- Accompagnement post-crédation des TPME (comptabilité, gestion RH, trésorerie, gestion de la qualité, etc.)
- Appui à l'accès au financement
- Appui en renforcement de capacités sur le digitalisation
- Conseil aux structures d'appui et de financement
- Approches utilisées : CEFE, NUCLEUS, MyCoop, GERME, GETAHEAD, etc.

Promotion de l'entrepreneuriat

Promotion des chaînes de valeur

- Cartographie des CdV
- Analyse économique, sociale et environnementale des CdV
- Développement des stratégies de mise à niveau des CdV en fonction des dimensions prioritaires de nos clients (emploi, adaptation au CC, genre ou autres)
- Mise en œuvre des solutions innovantes de mise à niveau (modèles et liens d'affaires commercialisation, normes et certifications, etc.) ;
- Approches utilisées : ValueLinks, MSA, etc.

Analyse et études thématique

- Promotion de intégration de l'approche genre et émancipation de la femme
- études liées à la protection de l'environnement et l'adaptation aux changements climatiques
- Etudes socioéconomiques
- Formations et renforcement de capacités
- Assistance technique

**Principaux
domaines
d'intervention
du cabinet**

PRÉSENTATION DE NOTRE CABINET

○ Pourquoi nous choisir ?



Notre bonne connaissance **des approches d'études, de prospection et de collecte de données sur le terrain**



Notre expertise en termes d'enquêtes terrain et collecte de données notamment d'une manière digitalisée



Notre **équipe principale** compétente et notre **équipe de backstopping** multidisciplinaire



Notre bonne connaissance du **contexte socio-économique** des zones pilotes du projet



Nos capacités de déroulement des missions présentesielles et à distance



Notre flexibilité et rapidité de répondre aux **besoins et orientations** de nos clients et **d'adaptation** aux changements de contexte et de perspectives.



Notre intérêt et veille à la réalisation des livrables **de qualité** et ainsi à cristalliser et à booster **notre notoriété**



Nos capacités à développer **des solutions novatrices** aux contraintes et challenges rencontrés au cours de la mission



Nos **moyens matériels** diversifiés et notre capacité à en acquérir plus en fonctions de besoin (Outils de communication, outils digitaux, outils didactiques, etc.)



Nos mécanismes fluides et efficaces en termes de **collaboration et de communication** avec nos clients



Notre **conseil technique et stratégique** objectif, réaliste et orienté action & solution



Notre forte capacité de **mobilisation des partenaires** du projet en utilisant des approches adaptées et contextualisées

CONTEXTE DE LA MISSION



COMPRÉHENSION DES PRESTATIONS

○ Contexte de la mission

L'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), à travers sa direction régionale de Marrakech-Safi, a engagé une opération de mise à niveau des pépinières afin d'améliorer les pratiques phytosanitaires. Cette initiative vise à harmoniser les méthodes de gestion des pépinières, renforcer le contrôle des organismes nuisibles et sensibiliser les acteurs du secteur aux référentiels techniques en vigueur.

Dans ce cadre, un dispositif d'assistance technique est prévu, articulé autour d'ateliers de sensibilisation, de visites de terrain et de diagnostics individualisés. L'objectif est d'accompagner les pépiniéristes vers une gestion plus rigoureuse, tout en assurant un suivi de la conformité de leurs structures par rapport aux exigences de l'ONSSA.



COMPRÉHENSION DES PRESTATIONS

○ Objectifs de la mission

La mission vise à appuyer les pépinières de la région Marrakech-Safi dans leur mise à niveau phytosanitaire à travers les actions suivantes :


- ☐ Évaluer les pratiques phytosanitaires au sein des 825 pépinières recensées dans la région
- ☐ Identifier les insuffisances et non-conformités par rapport aux référentiels de l'ONSSA
- ☐ Élaborer des recommandations personnalisées pour chaque pépinière
- ☐ Assurer un accompagnement technique dans la mise en œuvre de ces recommandations
- ☐ Vérifier les progrès réalisés lors des deux visites de suivi
- ☐ Organiser 12 ateliers de proximité à l'échelle régionale
- ☐ Clôturer la mission par un atelier de restitution et présenter les résultats finaux



COMPRÉHENSION DES TDR

- Cible de la mission


Cible	Rôle dans la mission
825 pépinières recensées	Améliorer les pratiques de gestion phytosanitaire et mettre en œuvre les référentiels ONSSA
Responsables techniques et gestionnaires	Bénéficiaires directs des actions d'accompagnement, des formations et des recommandations personnalisées
Agents de l'ONSSA	Suivi de la mission, validation des livrables, coordination avec le prestataire et encadrement technique
Parties prenantes du secteur	Participation aux ateliers de démarrage et de clôture, échange sur les résultats, renforcement du dialogue sectoriel

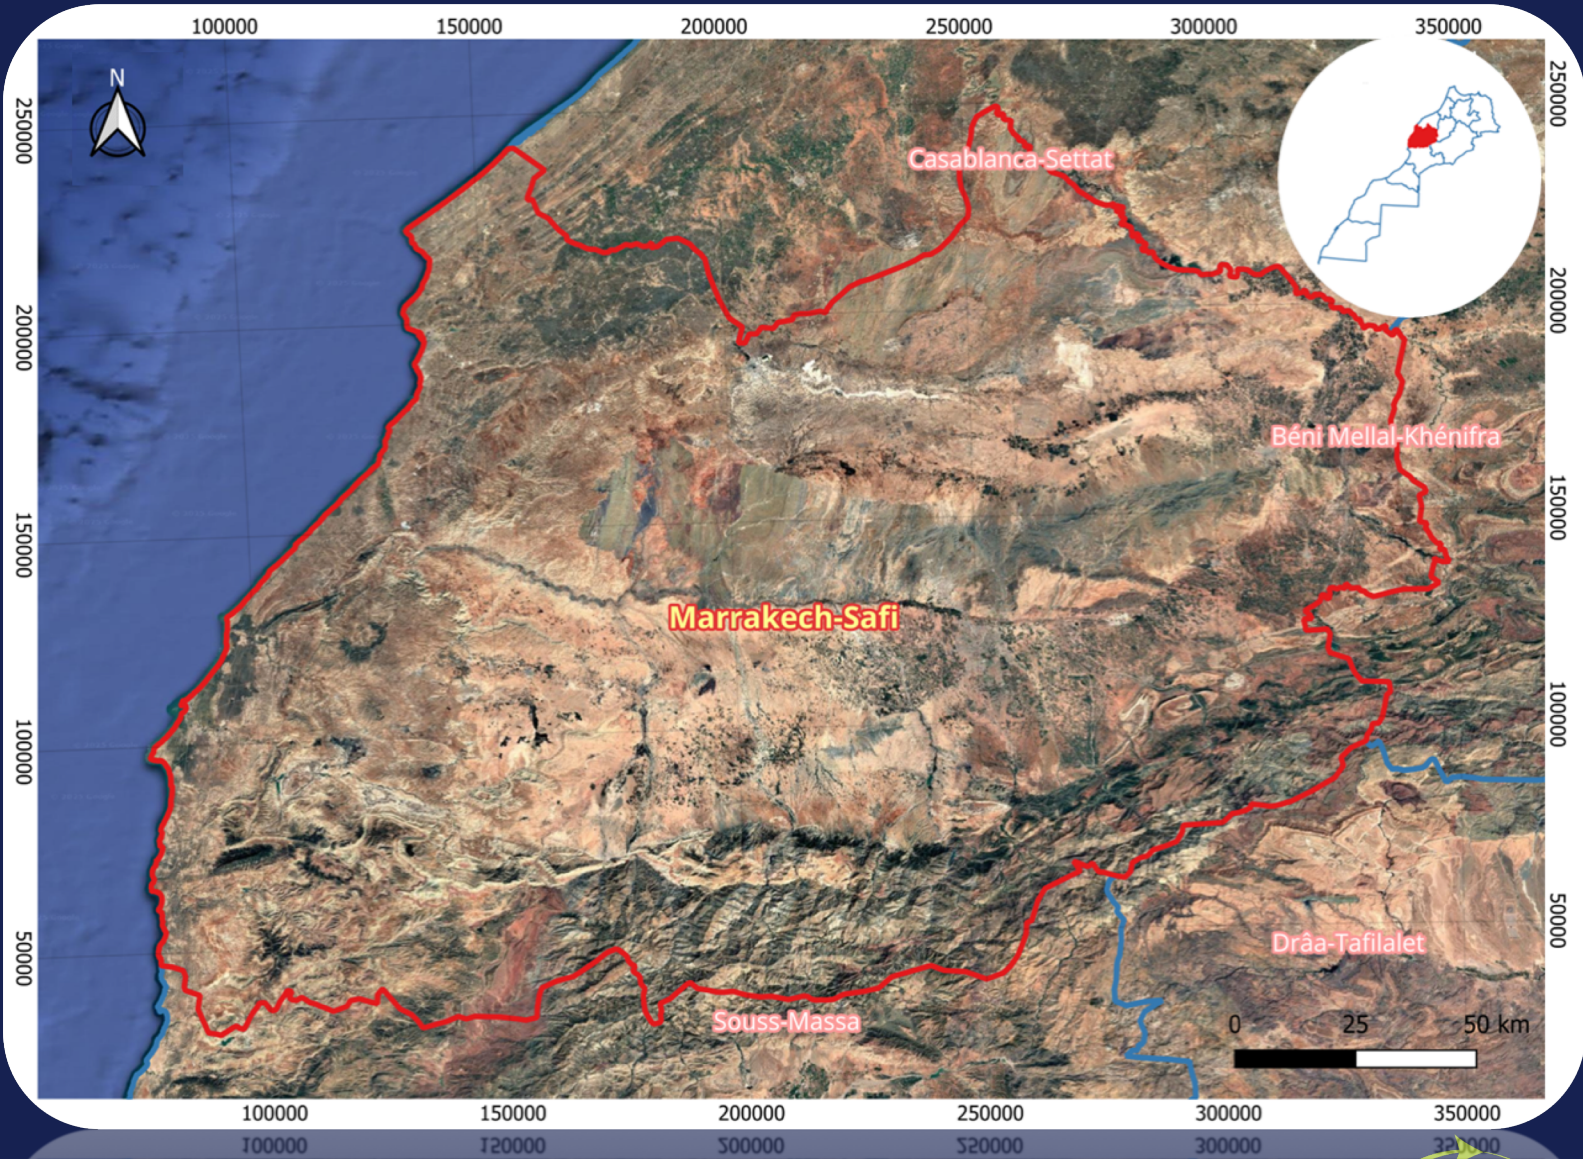

COMPRÉHENSION DES PRESTATIONS

Workflow de la mission

La mission se déroulera en plusieurs étapes successives, allant de la réunion de cadrage jusqu'à l'atelier de clôture. Chaque étape permettra d'évaluer, d'accompagner et de suivre la mise à niveau phytosanitaire des pépinières concernées, tout en assurant une coordination continue avec l'ONSSA et les parties prenantes.

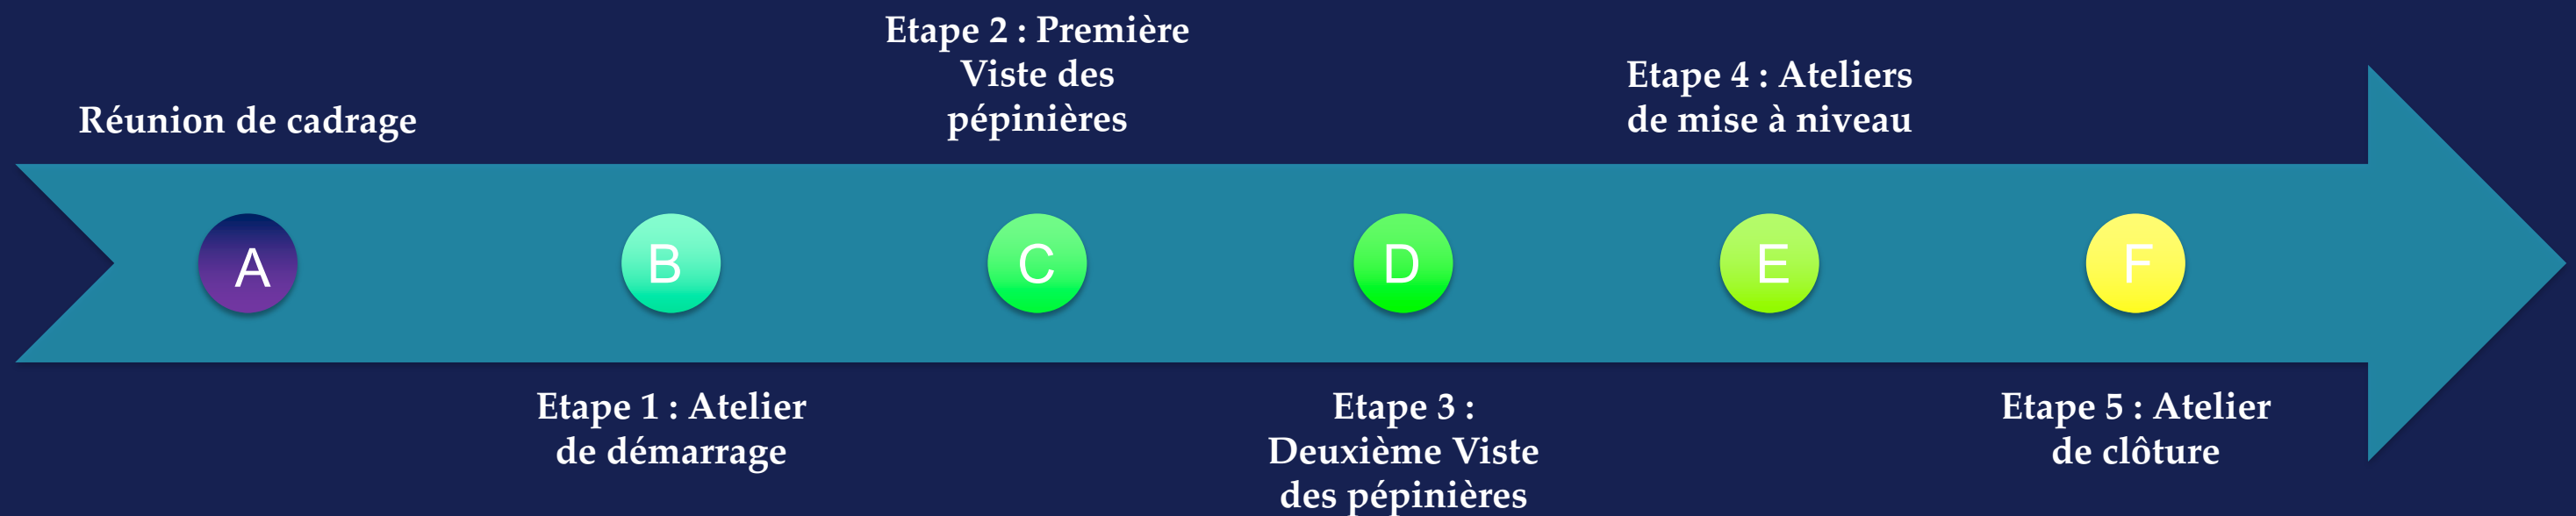

APPROCHE METHODOLOGIQUE



APPROCHE METHODOLOGIQUE

A Cadrage de la méthodologie

La réunion de cadrage constitue une étape essentielle pour assurer la bonne exécution de la mission d'assistance et d'accompagnement des pépinières en matière de gestion phytosanitaire. Elle vise à établir une compréhension partagée entre l'ONSSA et l'équipe du prestataire sur les objectifs de la mission, les modalités d'intervention et les outils à mobiliser. Aligner les objectifs de la mission avec les attentes de l'ONSSA.

- Aligner les attentes de l'ONSSA avec les objectifs opérationnels de la mission.
- Identifier les priorités régionales en matière de suivi phytosanitaire.
- Définir les rôles des membres de l'équipe projet (chef de projet, techniciens, coordinateurs).
- Fixer le planning global des visites et l'organisation logistique.
- Discuter des éventuelles contraintes d'accès aux sites (climat, calendrier des pépiniéristes, disponibilité locale).
- Mettre en place un canal de coordination avec le comité de suivi.



APPROCHE METHODOLOGIQUE

B Etape 1 : Atelier de démarrage

L'atelier de démarrage constitue une étape essentielle pour le lancement officiel de la mission. Il a pour objectif de :

- Présenter les objectifs, le calendrier et la méthodologie de mise à niveau des pépinières ;
- Partager les **référentiels phytosanitaires ONSSA** et les critères de conformité ;
- Informer les professionnels du secteur sur leur rôle et les modalités d'accompagnement prévues.

○ Activités prévues :

- 1 Organisation d'un **atelier régional à Marrakech**, dans un hôtel 4 étoiles validé par l'ONSSA
- 2 Participation de 100 personnes : ONSSA, pépiniéristes, acteurs institutionnels et partenaires
- 3 **Présentation du plan de travail détaillé** par le prestataire
- 4 **Présentation des référentiels ONSSA** (production, biosécurité, traçabilité)
- 5 **Distribution de 100 brochures** techniques sur la gestion phytosanitaire des pépinières
- 6 Recueil des observations et validation conjointe des étapes suivantes par le comité de suivi

APPROCHE METHODOLOGIQUE

C Etape 2 : Première visite des pépinières

Après l'atelier de démarrage, la mission se poursuit par une première série de visites couvrant l'ensemble des **825 pépinières** recensées dans la région de Marrakech-Safi. Cette étape a pour objectif principal de réaliser un diagnostic initial des pratiques phytosanitaires, d'évaluer la conformité par rapport aux référentiels ONSSA, et d'identifier les insuffisances nécessitant un accompagnement correctif.

1

Évaluation de la gestion
phytosanitaire

2

Remise et explication des
référentiels ONSSA à chaque
pépinière visitée

3

Identification des
organismes nuisibles et
préconisations techniques

4

Rédaction de rapports
individuels avec
recommandations concrètes
pour chaque pépinière

5

Remise d'un rapport
synthétique régional à la
direction régionale de
l'ONSSA

APPROCHE METHODOLOGIQUE

C Etape 2 : Première visite des pépinières

○ Évaluation de la gestion phytosanitaire

Le prestataire prépare un document de cadrage opérationnel précisant le déroulement de la mission, les outils de collecte de données, les référentiels à appliquer, ainsi que les modalités pratiques d'intervention. Ce plan de travail intègre :

Démarche d'intervention: Diagnostic phytosanitaire individualisé pour chaque pépinière, identification des pratiques, des non-conformités et formulation de recommandations personnalisées

Les outils de terrain mobilisés : Fiches de visite, canevas de rapport, checklists techniques, supports d'évaluation, référentiels phytosanitaires ONSSA imprimés et distribués

L'organisation des équipes (ingénieurs, techniciens), les rôles de chacun, et la coordination avec les services régionaux de l'ONSSA.

objectifs opérationnels à atteindre à chaque étape

calendrier de réalisation de la première visite (45 jours), y compris la programmation des tournées et les délais de remise des rapports


↑ Ce plan est validé par l'ONSSA lors de la réunion de cadrage régional, avant sa mise en œuvre par les équipes du prestataire, sous supervision du comité de suivi.

APPROCHE METHODOLOGIQUE

C Etape 2 : Première visite des pépinières


- Remise et explication des référentiels ONSSA à chaque pépinière visitée

Lors de cette étape, l'intervention sur site vise à effectuer un diagnostic phytosanitaire individualisé au sein des 825 pépinières recensées. Cette intervention est accompagnée par la distribution des référentiels ONSSA, leur explication détaillée, et une évaluation des écarts de conformité.




Fiche d'évaluation par pépinière

- Collecte d'informations sur :
 - Les structures physiques (serres, dispositifs de protection, etc.)
 - Les procédures internes (enregistrement, suivi, traçabilité)
 - La gestion des intrants phytosanitaires
- Notation par critères selon une grille validée



Référentiels ONSSA remis sur site

- Présentation des documents officiels de l'ONSSA sur :
 - Les exigences de production, de traçabilité, de contrôle sanitaire
 - Les mesures préventives contre la dissémination d'organismes nuisibles
- Explication sur les pratiques attendues et non-conformités fréquentes



Check-list de conformité terrain

- Outil structuré pour vérifier :
 - L'existence de procédures internes de surveillance
 - L'application des mesures d'hygiène et de biosécurité
 - Le niveau de préparation au contrôle phytosanitaire

➡ Chaque pépinière visitée fera l'objet d'un rapport individuel incluant les constats relevés, les recommandations proposées, et un justificatif de la remise des référentiels ONSSA. Un rapport synthétique global sur l'ensemble des visites sera également transmis à la DR ONSSA Marrakech-Safi.

APPROCHE METHODOLOGIQUE

C Etape 2 : Première visite des pépinières

○ Identification des organismes nuisibles et préconisations techniques

Après la remise et l'explication des référentiels ONSSA, la mission poursuit l'intervention terrain par une phase de diagnostic phytosanitaire approfondi. L'objectif est d'identifier les organismes nuisibles présents ou potentiels, d'en évaluer l'incidence, et de proposer des préconisations spécifiques pour chaque pépinière.

Préparation des documents ONSSA

Préparation en amont des référentiels à remettre (exigences phytosanitaires, biosécurité, bonnes pratiques). Les documents sont adaptés selon les types de pépinières rencontrées.

Présentation explicative sur site

Présentation orale du contenu des référentiels remis, avec focus sur les points critiques : surveillance sanitaire, traçabilité, traitement des végétaux, circulation de plants.

Interaction et sensibilisation

Un échange technique est engagé avec les responsables pour clarifier les obligations, répondre aux questions et s'assurer de la compréhension des documents remis.

Intégration dans le rapport et suivi

La remise est tracée dans le rapport de visite. Les documents remis servent de base pour formuler les recommandations spécifiques et orienter les étapes suivantes.

➡ Un rapport individuel est élaboré pour chaque pépinière visitée, consolidant :

- **les observations terrain,**
- **l'identification botanique des espèces cultivées,**
- **la détection des organismes nuisibles,**
- **et les recommandations à appliquer.**

➡ Un rapport synthétique est ensuite remis à la Direction Régionale de l'ONSSA.



APPROCHE METHODOLOGIQUE

D Etape 3 : Deuxième Viste des pépinières

La deuxième visite constitue une phase de suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la première visite. Elle vise à évaluer les progrès réalisés, à renforcer l'accompagnement technique sur les aspects non conformes, et à consolider l'adoption des référentiels phytosanitaires ONSSA.

Déroulement

1

Préparation de la mission de suivi

Analyse des rapports de la première visite, définition des éléments à contrôler par pépinière, élaboration de fiches de suivi individualisées.

2

Visite terrain et vérification des recommandations

Vérification de la mise en œuvre effective des recommandations, observation des améliorations apportées, recueil des difficultés persistantes.

3

Renforcement de l'appui technique


Réponses ciblées aux non-conformités résiduelles, rappels des bonnes pratiques, nouvelle explication des points mal appliqués des référentiels ONSSA.

4

Rédaction des rapports de suivi

Rapport par pépinière précisant l'état d'avancement, l'évolution du niveau de conformité et les recommandations complémentaires si nécessaire.

➡ Chaque rapport de deuxième visite doit inclure les **résultats du suivi**, les **recommandations actualisées**, et alimenter un rapport synthétique régional remis à la direction de l'ONSSA Marrakech-Safi.



APPROCHE METHODOLOGIQUE

D Etape 3 : Deuxième Viste des pépinières

○ Suivi technique et vérification des recommandations

L'objectif de cette étape est de s'assurer que les recommandations formulées lors de la première visite ont été comprises, mises en œuvre et appropriées par les pépiniéristes. Elle permet également d'identifier les blocages éventuels, de renforcer l'appui technique et d'adapter les mesures selon les contraintes de chaque site.

1 Objectifs de la deuxième visite

Cette étape s'inscrit dans une logique de continuité de l'accompagnement personnalisé. Les principales finalités sont :

- Vérifier la mise en œuvre des recommandations (infrastructures, pratiques, hygiène, documentation, etc.) ;
- Évaluer le niveau d'application des référentiels ONSSA ;
- Identifier les écarts persistants ou les difficultés spécifiques ;
- Maintenir un dialogue technique avec les gestionnaires pour ajustement si nécessaire.

2 Activités techniques réalisées sur le terrain

Vérification des améliorations	- Présence de nouveaux équipements, ajustement des procédures, changements observés
Contrôle documentaire	- Mise à jour des fiches de suivi, registres de traçabilité, procédures internes
Suivi des points critique	- Application effective des exigences liées à la biosécurité et aux organismes nuisibles
Réajustement technique	- Clarification des malentendus, réexplication des référentiels mal compris
Rapport de suivi individuel	- État d'avancement - niveau de conformité - recommandations complémentaires pour la suite

➡ Un rapport de suivi est rédigé pour **chaque pépinière visitée**, détaillant les constats, les progrès réalisés et les besoins résiduels. Ce rapport est un outil central de préparation à l'étape suivante (ateliers de mise à niveau).

APPROCHE METHODOLOGIQUE

E Étape 4 : Ateliers de mise à niveau

Cette étape vise à consolider l'ensemble du processus d'accompagnement à travers l'organisation de 12 ateliers de proximité, répartis dans les différentes provinces de la région Marrakech-Safi. Elle permet de :

- ❑ Renforcer les acquis techniques des pépiniéristes,
- ❑ Restituer les constats issus des deux premières visites,
- ❑ Proposer des mesures correctives complémentaires et
- ❑ Finaliser l'évaluation du niveau de conformité des pépinières visitées.



APPROCHE METHODOLOGIQUE


F Etape 5 : Atelier de clôture

La dernière étape de la mission consiste à organiser un atelier de restitution et de validation des résultats. Cet événement regroupe les représentants de la Direction Régionale de l'ONSSA Marrakech-Safi, les professionnels du secteur et les parties prenantes concernées. Il marque la clôture officielle de la mission.

Objectif principal	Présenter les résultats consolidés de la mission, partager les retours d'expérience, valider les livrables finaux.
Lieu	Hôtel d'au moins 4 étoiles à Marrakech, validé par la direction régionale de l'ONSSA.
Durée	1 journée complète.
Participants	Environ 50 personnes : représentants de l'ONSSA, professionnels du secteur, entités partenaires.
Contenu de l'atelier	- Présentation des résultats des trois visites- Discussion sur les constats communs- Formulation des recommandations finales- Validation des livrables finaux
Organisation logistique	Pause-café, déjeuner, matériel de présentation, support de restitution imprimé et/ou digital.
Résultats attendus	- Rapport de clôture incluant les échanges- Recommandations consolidées- Validation finale de la mission par le comité ONSSA.



Préparation
logistique &
invitations



Supports &
synthèse des
résultats



Restitution &
validation
collective



LIVRABLES



Les livrables des activités

Livrables

(6 mois)



Étape	Livrables
Étape 1	- Compte rendu de l'atelier - Supports de présentation - Liste des participants
Étape 2	- Fiches d'évaluation par pépinière - Rapports individuels avec recommandations - Rapport synthétique de la 1re visite
Étape 3	- Fiches de suivi - Rapports de progression par pépinière - Rapport synthétique de la 2eme visite
Étape 4	- Comptes rendus des 12 ateliers - Rapport global sur l'évolution de la conformité - Document de catégorisation des pépinières
Étape 5	- Rapport de clôture final - Présentation des résultats- Liste des participants

PERSONNEL



Systeme de gestion de projet

○ Affectation du personnel



Equipe principale



M. Hamid BABACHEIKH
(Chef de projet -ingénieur en Agronomie)



M. SMAIL AIT BAHADOU
(Ingénieur en protection des plantes)



M. ABDELLAH BENBYA
(Docteur en botanique)



M. M. Omar OUSTANI
(Technicien en protection
des plantes)



M. Zakaria Chouayh
(Technicien en protection
des plantes)



Mme Oumaima Allali
(Technicienne paysagiste)



Mme Nezha Ouikhlef
(Technicienne paysagiste)

PERSONNEL PROPOSÉ

Prénom & Nom	Rôle dans la mission	Formation	Expérience	Compétences techniques clés	Compétences linguistiques
Hamid BABACHEIKH	Chef de projet	Ingénieur d'État en Agronomie – ENA Meknès (2013)	10+ ans	- Supervision de projets d'assistance phytosanitaire - Coordination de visites de terrain, diagnostic et suivi des pépinières - Expertise en arboriculture, irrigation, protection phytosanitaire et cultures résilientes - Organisation d'ateliers et animation des réunions avec les parties prenantes	- Arabe - Français - Anglais
Smail AIT BAHADOU	Ingénieur en protection des plantes	Doctorat en Biologie – Université Moulay Ismaïl Ingénieur ENA Meknès – Protection des plantes	15+ ans	- Diagnostic phytosanitaire initial et avancé (identification des plantes, des ravageurs, prélèvements pour analyses) - Élaboration des rapports de recommandations par pépinière - Animation des ateliers de mise à niveau - Expérience en biocontrôle et évaluation des pratiques culturales	- Arabe - Français - Anglais
Abdellah BENBYA	Docteur en botanique	Docteur en Sciences biologiques - FSR/INRA Ingénieur d'État en Agronomie – ENA Meknès	+10 ans	- Identification botanique des espèces ornementales - Évaluation de la biodiversité des pépinières - Élaboration de rapports d'analyse des problèmes phytosanitaires - Contribution à la catégorisation des pépinières	- Arabe - Français - Anglais - Amazigh

PERSONNEL PROPOSÉ

Prénom & Nom	Rôle dans la mission	Formation	Expérience	Compétences techniques clés	Compétences linguistiques
M. Omar OUSTANI	Technicien 1 : en Protection des plantes	Diplôme de Technicien en Horticulture	9 ans	(Prospection et Surveillance des Cultures, Sensibilisation et Formation des Agriculteurs , Gestion des Projets de Reboisement et Aménagement Agricole , collecte et analyse , Utilisation des Outils Informatiques et SIG, diagnostic et accompagnement des exploitants agricoles)	- Français - Arabe
M. Zakaria Chouayh	Technicien 2 : en Protection des plantes	Diplôme de Technicien en Horticulture	6 ans	(diagnostic des cultures et identification des ravageurs et maladies ,Campagnes de lutte antiacridienne et gestion des nuisibles agricoles, techniques de lutte biologique et raisonnée ,optimisation des pratiques culturales et du rendement)	- Français - Arabe - Anglais

PERSONNEL PROPOSÉ

Prénom & Nom	Rôle dans la mission	Formation	Expérience	Compétences techniques clés	Compétences linguistiques
Mme Oumaima Allali	Technicienne 1: paysagiste	• Licence pro architecture de paysage (2023) • Technicienne en aménagement paysager (2021)	4 ans	• Infographiste et paysagiste en bureau d'études • Conduite de chantiers • Travail en pépinière • Études d'impact et modélisation 3D	- Arabe (très bon) - Français (bon) - Anglais (moyen)
Mme Nezha Ouikhlef	Technicienne 2: paysagiste	• Master en architecture de paysage (en cours) • Licence architecture de paysage • Technicienne en aménagement paysager	3 ans	• Paysagiste chez FLORABORA • Commerciale en végétaux • Stages en bureau d'études, pépinière, chantier • Suivi de chantiers et analyse de site	- Arabe (très bon) - Français (bon) - Anglais (moyen)

COORDINATION DE LA MISSION



COORDINATION DE LA MISSION

○ Suivi d'état d'avancement



Réunions hebdomadaires de check-up

Une réunion de suivi hebdomadaire avec le responsable de la mission sera planifiée chaque semaine pour discuter de :

- Etat d'avancement de la mission ;
- Noter des orientations spécifiques de l'équipe de projet ;
- Avoir des validations sur des étapes opérationnelles ;
- Check des livrables ;
- Partage des retours du partenaire.



Etat d'avancement du workplan

L'état d'avancement de la réalisation du workplan opérationnel du projet sera envoyé chaque mois et mettra en évidence : Tâche de la mission

- Deadlines planifiés pour chaque activité.
- Etat d'avancement
- Date réelle d'achèvement
- Source de vérification



Coordination avec les partenaires

Lors de la réalisation des Etapes de la mission, un rapport d'état d'avancement sera soumis pour apporter des précisions sur l'état d'avancement de la mission, entre autres :

- Progrès dans du diagnostic
- Progrès de préparation des supports
- Progrès de déroulement des formations
- Progrès de la rédaction des livrables...
- Etc.



Echange par email et par téléphone

Des échanges réguliers par email et par téléphone seront organisés entre la/le responsable du projet et le chef de la mission. Ces échanges auront pour objectifs principaux :

- Soumission de requêtes
- Soumission de livrables en versions Draft et finale
- Demande de renseignement/orientation
- Indication de nouvelle orientation

PLANNING DE LA MISSION



PLANNING DES ACTIVITÉS DE LA MISSION

Planning

Tâches	M1				M2				M3				M4				M5				M6			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
A. Cadrage de la mission	★																							
B. Etape 1 : Atelier de démarrage																								
• Préparation des supports et référentiels		★	★	★	★	★																		
• Organisation de l'atelier régional (100 participants)		★	★	★	★	★																		
• Présentation du plan de travail et référentiels ONSSA		★	★	★	★	★																		—
• Validation des étapes par le comité de suivi						★																		
C. Étape 2 : Première visite des pépinières																								
• Diagnostic des pratiques phytosanitaires (825unités)								★	★	★	★	★	★	★										
• Remise et explication des référentiels ONSSA								★	★	★	★	★	★	★										
• Collecte d'informations via fiche terrain et check-list								★	★	★	★	★	★	★										
• Élaboration d'un rapport individuel par pépinière														★										
D. Étape 3 : Deuxième visite des pépinières																								
• Planification ciblée selon les rapports initiaux														★	★	★	★	★	★					
• Visites terrain et vérification des recommandations														★	★	★	★	★	★					
• Renforcement technique des pratiques résiduelles														★	★	★	★	★	★					
E. Étape 4 : Ateliers de mise à niveau																								
• Organisation de 12 ateliers de proximité																	★	★	★	★				
• Analyse des écarts persistants																	★	★	★	★				
• Rédaction des rapports finaux (zone + pépinières)																				★				
F. Étape 5 : Atelier de clôture																								
• Préparation logistique et supports																					★	★	★	★
• Organisation de l'atelier																					★	★	★	★
• Rapport final de clôture																								★



ABI Consulting

Adresse :

N° 33 IMM F RESIDENCE AL AWAILE ANGLE AV
HASSAN II ET BD GHAZZA TEMARA

Tél :

+212 6 61 39 64 13

Email :

contact@abiconsulting.ma

RC :

144103, TEMARA

ICE :

002579010000023

RIB :

181810212111738847000536

Banque populaire, Agence Ryad, Rabat
