

Offre technique

Organisation des sessions de formation au profit du personnel de
l'Agence Nationale Pour le Développement des Zones Oasiennes
et de l'Arganier

OFFRES DE PRIX N°05/2026/ANDZOA du 08/04/2026

ABI CONSULTING
N° 33 IMM F RESIDENCE AL AWAILE ANGLE
AV HASSAN II ET BD CHAZZA TENDARA
ICE : 00257610040023 Tél : +216 6 61 39 64 1
Abmed Ben Hammou : Gérant

Réalisé par :



Pour le compte de :



SOMMAIRE

<u>1.</u>	<u>PRESENTATION DE ABI CONSULTING.....</u>	<u>4</u>
	A. QUI NOUS SOMME ?	4
	B. POURQUOI NOUS CHOISIR ?	4
	C. NOS MISSIONS	4
	D. LES PRINCIPAUX DOMAINES D'INTERVENTION DE NOTRE CABINET.....	4
	I. GESTION DE PROJETS, SUIVI-EVALUATION ET GESTION DES CONNAISSANCES.....	4
	II. PROMOTION D'ENTREPRENEURIAT	5
	III. PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR.....	5
	IV. FORMATIONS, RECHERCHE ANALYTIQUE ET ETUDE STRATEGIQUE	5
<u>2.</u>	<u>CONTEXTE, OBJECTIF ET CONSISTANCE DE LA MISSION.....</u>	<u>6</u>
	A. CONTEXTE DE LA MISSION.....	6
	B. OBJECTIF DE LA MISSION	6
	C. CONSISTANCE DE LA MISSION	7
<u>3.</u>	<u>COMPRÉHENSION DES TDR DE LA MISSION</u>	<u>10</u>
	A. INTERPRETATION DES OBJECTIFS DE LA MISSION	10
	B. WORKFLOW DE LA MISSION (AVEC LES LIVRABLES DEMANDES).....	13
<u>4.</u>	<u>STRATÉGIE ET APPROCHES.....</u>	<u>14</u>
	A. STRATEGIE.....	14
	I. LANCEMENT ET CADRAGE DE LA MISSION	14
	II. INGENIERIE DE LA FORMATION ET DEVELOPPEMENT DES CONTENUS	15
	III. MOBILISATION ET CONFIRMATION DES PARTICIPANTS.....	16
	IV. PREPARATION ET MISE EN ŒUVRE DES FORMATIONS.....	16
	V. DOCUMENTATION DE LA MISSION	18
	VI. CLOTURE DE LA MISSION	18
	B. APPROCHES	20
	I. APPROCHE PARTICIPATIVE	20
	II. APPROCHE PAR LA PRATIQUE	20
	III. DISPOSITIF D'INTERVENTION STRUCTURE	21
<u>5.</u>	<u>NOTE DÉTAILLÉE DES AXES ET DU CONTENU DES MODULES DE FORMATION.....</u>	<u>23</u>
	MODULE 1 : LES NOUVEAUTES FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2026	23
	MODULE 2 : ANALYSE ET VISUALISATION DES DONNEES (EXCEL AVANCE, POWER BI)	25
	MODULE 3 : FONCTIONNALITES AVANCEES DE MICROSOFT OUTLOOK ET ONEDRIVE	27
	MODULE 4 : MANAGEMENT DE PROJETS ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.....	29
	MODULE 5 : MARCHES PUBLICS AU MAROC : NOUVEAUTES, PROCEDURES ET BONNES PRATIQUES	30

	MODULE 6 : APPROCHE DE GESTION AXEE SUR LES RESULTATS (GAR)	32
<u>6.</u>	<u>ÉQUIPE PROPOSEE POUR LA MISSION</u>	<u>35</u>
<u>7.</u>	<u>PLANNING DE LA PRESTATION</u>	<u>37</u>

1. Présentation de ABI Consulting

A. Qui nous somme ?

ABI Consulting est un cabinet de formation et conseil présent au Maroc et qui intervient en appui de projets de développement d'acteurs publics, d'organismes de la coopération internationale et d'organisations de la société civile.

B. Pourquoi nous choisir ?

- Notre bonne connaissance des approches de mise en œuvre des sessions de formation ;
- Notre expertise en termes de réalisation des formations au profit des agriculteurs et agricultrices ;
- Notre intérêt et veille à la réalisation des livrables de qualité et ainsi à cristalliser et à booster notre notoriété ;
- Nos mécanismes fluides et efficaces en termes de collaboration et de communication avec nos clients ;
- Notre flexibilité et rapidité de répondre aux besoins et orientations de nos clients ;
- Notre forte capacité de mobilisation des partenaires et des bénéficiaires du projet en utilisant des approches adaptées et contextualisées ;
- Notre conseil technique et stratégique objectif et réaliste orienté action & solution ;
- Nos capacités à développer des solutions novatrices aux contraintes et challenges rencontrés au cours de la mission.

C. Nos missions

ABI Consulting a pour mission de promouvoir une offre pérenne de services de qualités, de proximité aux structures publiques et privées et d'organisme de coopération internationale, aux ONG et OSC désirant mettre en place des initiatives locales ou développer leurs activités en cours.

D. Les principaux domaines d'intervention de notre cabinet

i. Gestion de projets, Suivi-évaluation et gestion des connaissances

- Renforcement de capacité sur le montage, gestion et suivi et évaluation de projets ;
- Élaboration des systèmes de suivi & évaluation ;
- Élaboration des outils de collecte (en présentiel ou en virtuel) de données ;
- Élaboration de base de données interactives ;
- Réalisation présentielle ou virtuelle d'enquêtes M&E ;
- Traitement et analyse des données en utilisant des logiciels appropriés ;
- Réalisation d'état de référence de projet (baselines) ;
- Évaluation finale et à mi-parcours des projets de développement ;
- Conseil aux projets.

ii. Promotion d'entrepreneuriat

- Accompagnement pré-crédation des porteurs de projet (renforcement du profil entrepreneurial, identification d'idées d'affaires, élaboration des business plans, etc.) ;
- Appui à la création des TPME ;
- Accompagnement post-crédation des TPME (comptabilité, gestion RH, trésorerie, gestion de la qualité, etc.) ;
- Entrepreneuriat vert et éco-inclusif ;
- Appui à l'accès au financement ;
- Conseil aux structures d'appui et de financement ;
- Renforcement de capacités sur l'entrepreneuriat.

iii. Promotion des chaînes de valeur

- Cartographie des CdV ;
- Analyse économique, sociale et environnementale des CdV ;
- Développement d'une stratégie de mise à niveau des CdV en fonction des dimensions prioritaires de nos clients (emploi, adaptation au CC, genre ou autres) ;
- Mise en œuvre des solutions innovantes de mise à niveau (modèles et liens d'affaires, commercialisation, normes et certifications, etc.) ;
- Renforcement des capacités sur le développement des chaînes de valeurs et systèmes de marché.

iv. Formations, recherche analytique et étude stratégique

- Formations de différents types : Entrepreneuriat, OP, Suivi et évaluation...
- Enquêtes de terrain, Collectes et analyses des données primaires ;
- Recherches et analyses documentaires et bibliographiques ;
- Analyses et recherches qualitatives ;
- Analyses et recherches quantitatives.

2. Contexte, objectif et consistance de la mission

A. Contexte de la mission

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de formation continue, l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier (ANDZOA) a lancé l'Appel d'Offres Ouvert National sur Offres de Prix n°05/2026/ANDZOA portant sur **l'organisation des sessions de formation au profit du personnel de l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier**. Cette action s'inscrit dans une logique de renforcement des compétences du personnel de l'Agence, afin d'accompagner les évolutions juridiques, organisationnelles, technologiques et économiques qui impactent l'environnement de travail et les pratiques professionnelles.

À travers ce marché, l'ANDZOA vise à offrir à ses cadres et agents une opportunité structurée de perfectionnement professionnel, favorisant à la fois l'actualisation des connaissances, le partage des bonnes pratiques et le développement de savoir-faire directement mobilisables dans l'exercice de leurs fonctions. Les sessions prévues doivent ainsi contribuer à améliorer l'efficacité professionnelle des participants, à renforcer leurs capacités d'analyse, de gestion et de pilotage, et à consolider une culture de performance et d'apprentissage continu au sein de l'Agence.

B. Objectif de la mission

Le présent marché a pour objet **l'organisation et la dispense de sessions de formation au profit des agents de l'ANDZOA**, ainsi que **la prise en charge complète des participants** sur les plans logistique, pédagogique et organisationnel.

Plus spécifiquement, la mission vise à :

- Renforcer les compétences des participants sur des thématiques prioritaires liées à la fiscalité, à l'analyse et la visualisation des données, aux outils collaboratifs, au management de projets, aux marchés publics et à la gestion axée sur les résultats ;
- permettre une meilleure appropriation d'outils et de méthodes favorisant l'efficacité administrative, la conformité réglementaire, l'aide à la décision et l'amélioration du travail collaboratif ;
- assurer une montée en compétences concrète et directement opérationnelle grâce à une démarche pédagogique axée sur la pratique, les études de cas, les mises en situation et les simulations ;

- Garantir des conditions optimales de déroulement des formations, à travers une organisation logistique complète intégrant salles équipées, hébergement, restauration, kits pédagogiques et supports de formation.

C. Consistance de la mission

La mission porte sur l'organisation, la préparation, l'animation et l'évaluation de **six (06) sessions de formation** destinées au personnel de l'ANDZOA, à réaliser dans la **ville de Marrakech**, conformément aux prescriptions du CPS. ABI Consulting s'engage à assurer à la fois la dimension pédagogique des formations et l'ensemble des prestations logistiques associées à la prise en charge des participants.

C.1) Les sessions de formation portent sur les thématiques suivantes :

N°	Thème de la formation	Durée (jours)	Nombre de participants	Nombre de nuitées
1	Les nouveautés fiscales de la Loi de Finances 2026	2	12	36
2	Analyse et visualisation des données (Excel avancé, Power BI)	2	12	36
3	Fonctionnalités avancées de Microsoft Outlook et OneDrive	2	12	36
4	Management de projets et Intelligence Artificielle	2	12	36
5	Marchés publics au Maroc : nouveautés, procédures et bonnes pratiques	2	12	36
6	Approche de Gestion Axée sur les Résultats (GAR)	2	12	36

L'ensemble de ces modules s'inscrit dans une logique de professionnalisation ciblée du personnel de l'Agence, avec des contenus conçus pour répondre aux besoins opérationnels des participants et aux exigences de modernisation des pratiques administratives et managériales.

C.2) Les principales composantes de la mission comprennent :

Ingénierie pédagogique

- Élaboration et/ou adaptation des contenus de formation pour chaque module, en cohérence avec les objectifs et axes fixés par le CPS ;
- Préparation des supports pédagogiques et des exercices pratiques ;
- Mobilisation de formateurs qualifiés répondant aux exigences du marché ;
- Animation des sessions selon une approche participative, interactive et orientée vers l'application pratique.

Organisation pédagogique et animation

- Conduite de sessions dynamiques privilégiant les études de cas, les mises en situation et les simulations ;
- Facilitation des échanges entre participants et valorisation des retours d'expérience ;
- Évaluation des acquis à travers des tests de connaissance en fin de session.

Logistique et équipements

- Mise à disposition de salles de formation adaptées, équipées et fonctionnelles ;
- Fourniture des équipements nécessaires : vidéoprojecteur, écran, tableau, connexion Wi-Fi, rallonges, paperboard, marqueurs et autres supports requis ;
- Organisation des sessions dans des conditions matérielles garantissant le confort et la qualité d'apprentissage.

Prise en charge des participants

- Hébergement des participants en **chambres individuelles** dans un hôtel **au moins 4 étoiles**, en **demi-pension** ;
- Restauration durant la formation conformément au CPS, comprenant notamment la pause-café du matin et le déjeuner ;
- Mise à disposition d'un kit pédagogique pour chaque participant comprenant au minimum bloc-notes, stylo, support papier de formation et support numérique.

Suivi, évaluation et reporting

- Établissement des feuilles de présence signées ;
- Collecte des évaluations des participants sur le déroulement et l'efficacité de chaque session ;
- Préparation, à l'issue de chaque module, d'un rapport retraçant le déroulement pédagogique et logistique de la formation, accompagné d'une synthèse des appréciations recueillies ;
- Remise des attestations de formation aux bénéficiaires ;

- Élaboration, à l'achèvement du marché, d'un rapport d'évaluation global.

C.3) Modalités pratiques

La durée globale d'exécution de la mission est fixée à **six (06) mois** à compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations. Le programme de déroulement des formations sera arrêté d'un commun accord entre le maître d'ouvrage et le titulaire du marché.

ABI CONSULTING s'engage à assurer l'ensemble des prestations conformément à son offre technique, en mobilisant les moyens humains et matériels proposés, et en veillant au strict respect des exigences pédagogiques, logistiques et organisationnelles prévues par le CPS et le RC.

3. Compréhension de la consistance de la mission

A. Interprétation des objectifs de la mission

L'analyse du Cahier des Prescriptions Spéciales et du Règlement de Consultation de l'Appel d'Offres n°05/2026/ANDZOA montre que la mission porte sur l'**organisation de sessions de formation au profit du personnel de l'ANDZOA**, avec une double exigence : d'une part, assurer un **renforcement ciblé des compétences** des cadres et agents de l'Agence sur des thématiques prioritaires ; d'autre part, garantir une **prise en charge logistique complète et conforme** permettant le bon déroulement des sessions dans des conditions optimales de qualité, de confort et d'efficacité pédagogique.

À travers ce marché, l'ANDZOA cherche à accompagner l'évolution des pratiques professionnelles de son personnel, en réponse aux changements juridiques, organisationnels, technologiques et économiques qui impactent son environnement d'intervention. Les formations prévues ne relèvent donc pas d'une simple mise à niveau théorique ; elles constituent un véritable levier d'amélioration des performances individuelles et collectives, de sécurisation des pratiques administratives et de professionnalisation des méthodes de travail au sein de l'Agence.

Les objectifs poursuivis s'inscrivent, à notre sens, dans les dimensions suivantes :

◆ 1. Dimension technique et opérationnelle

- Permettre aux participants de maîtriser des contenus actualisés et directement mobilisables dans leurs fonctions ;
- Renforcer les capacités des agents en matière de **fiscalité**, notamment à travers l'appropriation des nouveautés introduites par la Loi de Finances 2026 ;
- Développer les compétences d'**analyse, de traitement et de visualisation des données** à travers l'usage avancé d'Excel et de Power BI ;
- Améliorer l'utilisation professionnelle des outils collaboratifs et de productivité, notamment **Microsoft Outlook et OneDrive** ;
- Consolider les capacités en **management de projets**, en intégrant les apports de l'**intelligence artificielle** dans l'organisation, la communication et l'analyse ;
- Renforcer la maîtrise des **marchés publics**, tant au niveau des nouveautés réglementaires que des procédures de passation, de gestion et de sécurisation juridique ;
- Diffuser les principes et outils de la **gestion axée sur les résultats**, afin d'améliorer la planification, le suivi et l'évaluation des interventions de l'Agence.

◆ 2. Dimension managériale et organisationnelle

- Favoriser l'adaptation du personnel aux évolutions de l'organisation du travail et aux nouvelles exigences de performance ;
- Renforcer les capacités d'aide à la décision, de reporting, d'analyse et de pilotage ;
- Promouvoir une culture de résultat, de conformité, de redevabilité et d'amélioration continue ;
- Encourager le partage des bonnes pratiques et l'apprentissage mutuel entre intervenants et participants, conformément à l'esprit du CPS.

◆ 3. Dimension pédagogique et qualitative

La lecture des TdR montre également que l'ANDZOA attend une démarche de formation **fortement appliquée**, fondée sur une organisation pédagogique efficace et interactive. Les sessions doivent être animées de manière dynamique, en privilégiant les **études de cas**, les **misés en situation** et les **simulations**, afin d'assurer une meilleure assimilation des contenus et leur transfert vers les situations professionnelles réelles. Cette orientation confirme que le marché accorde une importance majeure non seulement à la qualité des contenus, mais aussi à la méthodologie d'animation et à la capacité des formateurs à produire des apprentissages concrets et durables.

◆ 4. Dimension logistique et de prise en charge

Les TdR ne limitent pas la mission à la seule animation des formations. Ils imposent également d'assurer l'ensemble des prestations logistiques associées, notamment la mise à disposition de **salles équipées**, l'**hébergement en hôtel au moins 4 étoiles** en chambres individuelles, la **restauration** conformément aux exigences du CPS, ainsi que la remise d'un **kit pédagogique complet** à chaque participant. Cette composante logistique constitue une condition essentielle de réussite des sessions et participe directement à la qualité globale de la prestation attendue.

En ce sens, chaque session de formation doit être comprise comme une unité complète de prestation intégrant :

- Une préparation pédagogique rigoureuse ;
- La mobilisation d'un formateur qualifié correspondant au module concerné ;
- Une animation structurée autour des objectifs et axes fixés par le CPS ;
- Un dispositif d'évaluation des acquis et d'appréciation du déroulement ;
- La production des livrables exigés à l'issue de chaque session.


Par ailleurs, le délai global d'exécution du marché est fixé à **six (06) mois** à compter de l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations. Le programme de déroulement des formations devant être arrêté d'un commun accord avec le maître

d'ouvrage, cela suppose une planification rigoureuse, une forte capacité de coordination et une organisation suffisamment souple pour s'adapter aux contraintes de l'ANDZOA tout en respectant les exigences de qualité, de délai et de conformité prévues par les documents du marché.

Cette lecture des termes de référence confirme ainsi que la mission repose sur une vision intégrée, articulée autour de quatre engagements majeurs :

- ✓ une **ingénierie pédagogique pertinente**, adaptée aux objectifs spécifiques de chaque module ;
- ✓ une **mobilisation de formateurs qualifiés**, répondant strictement aux profils et conditions exigés par le RC ;
- ✓ une **organisation logistique maîtrisée**, conforme aux standards fixés par le CPS ;
- ✓ un **dispositif de suivi, d'évaluation et de reporting** permettant de garantir la qualité d'exécution de chaque session et la traçabilité des résultats obtenus.

B. Workflow de la mission (avec les livrables demandés)

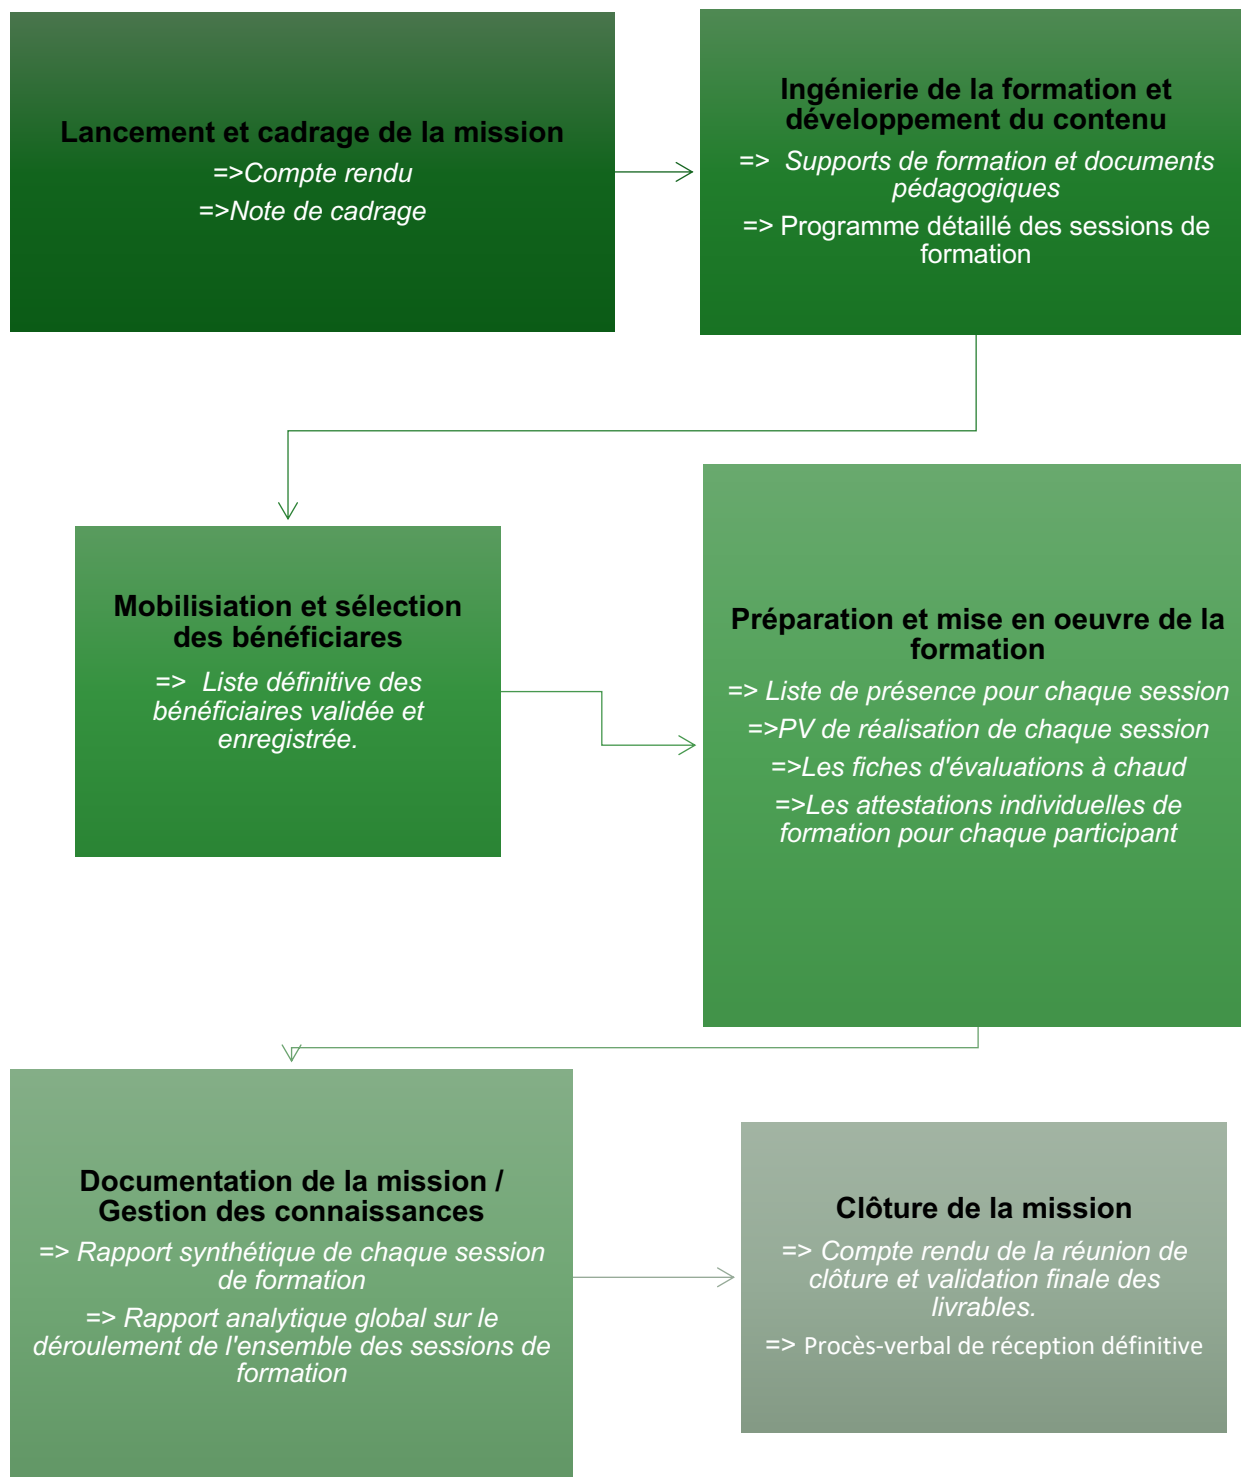

4. Stratégie et approches

A. Stratégie

i. Lancement et cadrage de la mission

Dès la notification officielle du marché, une réunion de lancement sera organisée entre notre cabinet et le Maître d'Ouvrage, afin de partager une compréhension commune des attentes de la mission, d'arrêter les modalités opérationnelles de mise en œuvre et de convenir du calendrier prévisionnel de déploiement des sessions de formation. Cette étape de cadrage constitue un préalable indispensable à la bonne exécution des prestations, d'autant plus que le programme de déroulement des formations doit être arrêté d'un commun accord entre le maître d'ouvrage et le titulaire.

L'objectif de cette phase est d'assurer un démarrage concerté, structuré et orienté résultats, en intégrant dès l'amont les exigences pédagogiques, organisationnelles et logistiques du marché. Elle permettra notamment de confirmer les modalités de coordination avec l'ANDZOA, de valider l'enchaînement des six modules de formation, d'identifier les contraintes spécifiques liées à la disponibilité des participants, et de fixer le circuit de validation des supports et des livrables. Le suivi de l'exécution étant confié à un agent désigné par l'ANDZOA, cette réunion permettra également de clarifier les rôles respectifs, les modalités d'échange et les procédures de remontée d'information durant toute la durée de la mission.

Objectifs spécifiques de la réunion de lancement :

- Clarifier les attendus de la mission et confirmer le périmètre exact des prestations
- Valider le calendrier indicatif de déploiement des six sessions de formation ;
- Confirmer l'affectation des formateurs par module, conformément aux exigences du RC ;
- Arrêter le dispositif logistique global : salles, hébergement, restauration, kits pédagogiques et supports ;
- Définir les outils de coordination, de suivi et de validation des livrables ;
- Convenir des modalités pratiques des réunions de cadrage, de suivi et de traitement des éventuelles difficultés d'exécution.

Livrables attendus pour cette phase :

1. Une note de cadrage de la mission comprenant le planning prévisionnel des sessions, la feuille de route de mise en œuvre, la répartition des responsabilités et le calendrier de production des livrables ;
2. Un compte rendu de la réunion de lancement reprenant les décisions actées, les ajustements convenus et les points de vigilance pour la suite de la mission.

ii. Ingénierie de la formation et développement des contenus

L'ingénierie pédagogique de la mission sera construite sur la base des six modules prévus par le CPS, à savoir : les nouveautés fiscales de la Loi de Finances 2026 ; l'analyse et la visualisation des données (Excel avancé, Power BI) ; les fonctionnalités avancées de Microsoft Outlook et OneDrive ; le management de projets et l'intelligence artificielle ; les marchés publics au Maroc ; et l'approche de gestion axée sur les résultats (GAR). Chaque module fera l'objet d'une structuration pédagogique spécifique, en cohérence avec les objectifs et axes fixés dans le CPS.

Notre démarche reposera sur une ingénierie de formation centrée sur les besoins fonctionnels des cadres et agents de l'ANDZOA. Les contenus seront conçus de manière à être immédiatement utiles dans l'exercice quotidien des fonctions des participants, en mettant l'accent sur l'applicabilité opérationnelle, la sécurisation des pratiques professionnelles, l'amélioration du pilotage et le renforcement des capacités d'analyse et de décision. Conformément au CPS, les sessions seront animées selon une approche dynamique et interactive, privilégiant les études de cas, les mises en situation et les simulations.

Chaque module donnera lieu à la préparation d'un programme détaillé comprenant :

- Les objectifs pédagogiques visés ;
- Le découpage du contenu par séquences ;
- Les méthodes d'animation retenues ;
- Les exercices pratiques et études de cas ;
- Les modalités d'évaluation des acquis ;
- Les supports remis aux participants en version papier et numérique.

Principes méthodologiques retenus :

- Adaptation des contenus au niveau et aux fonctions des participants ;
- Articulation équilibrée entre apports théoriques, illustrations concrètes et exercices appliqués ;
- Valorisation du partage d'expériences entre participants ;
- Production de supports pédagogiques clairs, structurés et exploitables après la formation ;
- Alignement strict des contenus sur les axes prévus par le CPS pour chaque module.

Livrables attendus pour cette phase :

1. Les supports de formation par module, en version papier et numérique ;
2. Les programmes détaillés des sessions ;

3. Les fiches pédagogiques correspondantes, incluant objectifs, séquences, méthodes et modalités d'évaluation.

iii. Mobilisation et confirmation des participants

Contrairement à une mission ouverte sur des bénéficiaires externes, la présente prestation concerne exclusivement le personnel de l'ANDZOA. La présente phase portera donc non pas sur une sélection de bénéficiaires, mais sur la **mobilisation, la confirmation et l'organisation de la participation** des agents concernés par chaque module. Cette étape sera conduite en étroite coordination avec le maître d'ouvrage, sur la base des listes de participants communiquées ou validées par l'Agence.

L'objectif sera de sécuriser en amont l'organisation de chaque session, en disposant pour chaque module d'une liste nominative stabilisée des participants, permettant d'anticiper les besoins logistiques, de préparer les kits pédagogiques, de réserver les chambres et d'organiser l'accueil dans les meilleures conditions. Compte tenu du format retenu par le CPS, chaque session concerne 12 participants et s'étend sur 2 jours, avec 36 nuitées par module.

Activités principales de cette phase :

- Réception et consolidation des listes de participants par module ;
- Confirmation des présences avec le maître d'ouvrage ;
- Préparation des tableaux logistiques par session ;
- Anticipation des besoins d'hébergement, de restauration et de kits ;
- Préparation des feuilles de présence et des documents administratifs nécessaires au déroulement des sessions.

Livrables attendus pour cette phase :

1. Les listes nominatives des participants par session ;
2. Le planning consolidé des sessions validé avec l'ANDZOA ;
3. Les états préparatoires de prise en charge logistique par module.

iv. Préparation et mise en œuvre des formations

Cette phase constitue le noyau opérationnel de la mission. Elle couvre l'ensemble des opérations nécessaires à la bonne tenue des sessions, depuis la préparation matérielle jusqu'à l'animation pédagogique et au suivi immédiat de chaque module. Toutes les formations se dérouleront dans la ville de Marrakech, dans des conditions conformes aux exigences du CPS.

ABI Consulting s'engage à assurer la mise à disposition de salles équipées et adaptées, dans le même lieu que l'hébergement des participants, avec les équipements requis : vidéoprojecteur, écran, tableau, flipchart, connectivité Wi-Fi, prises et rallonges, climatisation/chauffage et eau minérale. L'hébergement sera assuré en chambres

individuelles, en demi-pension, dans un hôtel au moins 4 étoiles, tandis que la restauration couvrira au minimum la pause-café du matin et le déjeuner, conformément au descriptif du CPS. Chaque participant recevra également un kit pédagogique comprenant bloc-notes, stylo, support papier et support numérique.

Sur le plan pédagogique, chaque session sera animée par un formateur dédié au module concerné, conformément aux profils exigés par le RC. Les intervenants mobilisés devront justifier du diplôme requis, de la spécialité attendue et d'au moins trois expériences similaires dans le domaine concerné. Un même membre de l'équipe ne pouvant être proposé sur plusieurs spécialités, l'affectation des ressources humaines sera faite avec une vigilance particulière afin de garantir la parfaite conformité de l'offre et la qualité de l'animation.

Activités principales de cette phase :

1. Préparation logistique

- Réservation et validation de l'hôtel et des salles ;
- Vérification des équipements et installation du matériel ;
- Préparation des supports, des kits et des documents de session.

2. Animation pédagogique

- Conduite des sessions par des formateurs qualifiés ;
- Animation participative à travers études de cas, mises en situation et simulations ;
- Accompagnement des participants dans l'appropriation des outils et méthodes.

3. Suivi et évaluation

- Administration d'un test de connaissance à l'issue de chaque session ;
- Collecte des fiches d'évaluation de la formation ;
- Enregistrement des observations utiles à l'amélioration continue des modules suivants.

Livrables attendus pour cette phase :

1. Feuilles de présence signées et contresignées ;
 2. Supports pédagogiques remis aux participants ;
 3. Kits pédagogiques distribués ;
 4. Attestations de formation remises aux bénéficiaires ;
 5. Première matière documentaire nécessaire à la rédaction du rapport de session.
-

v. Documentation de la mission

La documentation constitue une composante essentielle du marché. Elle vise à assurer la traçabilité complète de l'exécution des prestations, à documenter le déroulement des sessions et à mettre à la disposition de l'ANDZOA l'ensemble des pièces justificatives et livrables exigés. À l'issue de chaque session, ABI Consulting s'engage à remettre un ensemble documentaire complet, conforme aux dispositions du CPS.

Cette phase reposera sur une organisation rigoureuse des pièces produites pendant la mission, afin de garantir la conformité administrative et technique du dossier de chaque module. Les documents seront classés, vérifiés et consolidés au fur et à mesure, afin de faciliter la vérification par le maître d'ouvrage et de préparer le rapport d'évaluation final à l'achèvement du marché.

Activités principales :

1. Collecte et organisation des feuilles de présence, supports remis, évaluations, photos et pièces logistiques ;
2. Rédaction d'un rapport de session pour chaque module, couvrant le déroulement pédagogique, la prise en charge logistique et la synthèse des appréciations des participants ;
3. Préparation de la clé USB/documentation numérique contenant les supports, exercices, photos et documents utiles ;
4. Consolidation des données d'évaluation en vue du rapport final de la mission.

Livrables attendus pour cette phase :

1. Un rapport par session ;
2. Un support numérique par session ;
3. Un set de photos illustrant le déroulement de la formation ;
4. Un exemplaire du kit distribué ;
5. Les attestations de participation.

vi. Clôture de la mission

La phase de clôture intervient à l'achèvement de l'ensemble des six sessions de formation. Elle vise à dresser un bilan global de la mission, à consolider les résultats obtenus et à remettre au maître d'ouvrage le rapport final d'évaluation prévu par le CPS. Cette phase permet également de capitaliser les acquis de la mission, d'identifier les points forts observés, les difficultés éventuelles rencontrées et les recommandations utiles pour de futures actions de formation interne.

Le rapport final sera structuré autour des dimensions prévues par le CPS, notamment les objectifs pédagogiques et opérationnels, la planification des sessions, la qualité de l'animation et des outils pédagogiques, le contenu, les supports, les conditions

matérielles, le déroulement des formations ainsi que le niveau de motivation et de participation des bénéficiaires. La clôture formalisera ainsi la bonne exécution du marché et préparera les conditions de sa réception par le maître d'ouvrage.

Livrables attendus pour cette phase :

1. Un rapport final d'évaluation couvrant l'ensemble de la mission ;
2. Un dossier documentaire consolidé de toutes les sessions ;
3. Une note de synthèse présentant les principaux enseignements et recommandations ;
4. L'ensemble des pièces justificatives nécessaires à la vérification du service fait.

B. Approches

Dans le cadre de la mission d'organisation et d'animation des sessions de formation au profit du personnel de l'ANDZOA, notre dispositif repose sur des **approches pédagogiques actives, participatives et orientées vers la pratique**, en parfaite cohérence avec les exigences du CPS et du RC. L'objectif est de garantir une montée en compétences concrète des participants, en privilégiant des modalités d'apprentissage qui facilitent l'appropriation des contenus, leur application immédiate dans le cadre professionnel et la capitalisation des acquis au sein de l'Agence.

Ces approches s'articulent autour de trois piliers complémentaires :

i. Approche participative

- **Implication active des participants**
Les sessions seront animées de manière interactive afin de favoriser l'échange, la réflexion collective et le partage d'expériences entre cadres et agents de l'ANDZOA. Cette approche se traduira par des séquences de brainstorming, des discussions guidées, des travaux en sous-groupes et des restitutions collectives permettant aux participants de confronter leurs pratiques et de tirer parti des expériences professionnelles de chacun.
- **Ancrage dans les réalités professionnelles de l'Agence**
Les études de cas et exercices mobilisés seront construits à partir de situations proches des missions exercées au sein de l'ANDZOA : traitement de données et reporting, organisation du travail collaboratif, planification et suivi de projets, conformité fiscale et administrative, gestion de la commande publique, ou encore pilotage axé sur les résultats. Cette contextualisation permettra de relier directement les apports de la formation aux besoins opérationnels des participants.
- **Adaptation continue des contenus et de l'animation**
Un recueil permanent des retours des participants sera assuré tout au long des sessions, notamment à travers les échanges en séance, les observations des formateurs et les évaluations de fin de module. Cette logique d'ajustement progressif permettra d'adapter le rythme, les illustrations, le niveau de technicité et les modalités d'animation afin de garantir une meilleure assimilation des apprentissages.

ii. Approche par la pratique

- **Mises en situation et exercices appliqués**
Conformément à l'esprit du CPS, les formations accorderont une place centrale aux études de cas, aux simulations et aux mises en situation. Chaque module intégrera des exercices pratiques permettant aux participants de manipuler les outils, de tester des méthodes et d'appliquer les concepts abordés à des

situations concrètes : analyse d'un jeu de données sur Excel ou Power BI, organisation optimisée d'un espace de travail collaboratif via Outlook et OneDrive, analyse d'un cas de marché public, élaboration d'une chaîne de résultats ou lecture des impacts d'une mesure fiscale.

- **Exploitation de documents et cas professionnels**

Les contenus seront illustrés par des supports directement inspirés de la pratique administrative et managériale : tableaux de suivi, rapports, indicateurs, documents de planification, cas de procédures de marchés, exemples d'organisation documentaire, tableaux de bord ou scénarios de pilotage. Cette approche permettra de transformer la formation en espace de résolution de problèmes et d'amélioration des pratiques.

- **Apprentissage par l'outil**

Pour les modules techniques, l'apprentissage reposera sur une utilisation directe des outils concernés, afin de favoriser une maîtrise opérationnelle plutôt qu'une simple connaissance théorique. Les participants seront amenés à produire, analyser, structurer ou interpréter des contenus et résultats pendant la formation elle-même, ce qui renforcera l'utilité immédiate des sessions.

iii. Dispositif d'intervention structuré

- **Coordination étroite avec le maître d'ouvrage**

La mise en œuvre des formations s'effectuera en coordination continue avec l'ANDZOA, notamment pour l'arrêt du calendrier des sessions, la validation des contenus, l'organisation logistique et le suivi de l'exécution. Cette coordination garantira la cohérence de l'intervention avec les attentes du maître d'ouvrage et le respect des prescriptions du marché.

- **Mobilisation de formateurs qualifiés par module**

Chaque session sera assurée par un intervenant présentant le profil exigé par le RC, tant en matière de diplôme que de spécialité et d'expérience similaire. L'affectation d'un formateur dédié à chaque module permettra de garantir une animation de qualité, techniquement solide et alignée sur les objectifs spécifiques de la formation concernée.

- **Organisation logistique complète et conforme**

Notre approche intègre la totalité des exigences logistiques prévues par le CPS : salle de formation équipée, hébergement en hôtel au moins 4 étoiles dans le même lieu que la formation, restauration conforme au descriptif demandé, mise à disposition des kits pédagogiques et supports papier/numériques. Cette maîtrise logistique est conçue comme un facteur essentiel de réussite pédagogique.

- **Pédagogie claire, structurée et accessible**

Les contenus seront présentés de manière progressive et didactique, avec

recours à des supports visuels, schémas, tableaux de synthèse, démonstrations guidées et exercices commentés. L'objectif est de rendre accessibles des thématiques parfois techniques ou réglementaires, tout en maintenant un haut niveau de rigueur et de pertinence professionnelle.

- **Suivi, évaluation et amélioration continue**

Chaque session sera accompagnée d'un dispositif de suivi comprenant feuilles de présence, test de connaissance, évaluation de la formation et rapport de session. Ce dispositif permettra à la fois de documenter l'exécution, d'apprécier la qualité des prestations et d'alimenter une logique d'amélioration continue d'un module à l'autre.

Cette combinaison d'approches permet ainsi de proposer une intervention à la fois **rigoureuse, pratique, interactive et directement utile** pour le personnel de l'ANDZOA. Elle garantit une formation centrée sur les besoins réels des participants, conforme aux exigences du marché et orientée vers des résultats concrets en matière de renforcement des capacités, d'amélioration des pratiques professionnelles et de performance organisationnelle.

.

5. Note détaillée des axes et du contenu des modules de formation

Dans le cadre de la présente mission, chaque module de formation sera conçu selon une logique de **transfert opérationnel de compétences**, combinant apports méthodologiques, illustrations concrètes, études de cas, exercices pratiques et échanges d'expériences. Les contenus seront adaptés aux besoins des cadres et agents de l'ANDZOA, afin de garantir une appropriation progressive et une application directe dans les situations professionnelles.

Module 1 : Les nouveautés fiscales de la Loi de Finances 2026

Objectif du module

Permettre aux cadres et agents de l'ANDZOA de comprendre, maîtriser et appliquer efficacement les nouveautés fiscales introduites par la Loi de Finances 2026, afin d'en mesurer les impacts financiers, budgétaires et opérationnels et de sécuriser la conformité fiscale de leurs pratiques administratives.

Contenu détaillé du module

Axe 1 : Contexte général et orientations de la Loi de Finances 2026

Cet axe permettra de situer la Loi de Finances 2026 dans son environnement économique, budgétaire et fiscal. Il introduira les principales orientations de la politique fiscale, les objectifs de réforme poursuivis par les pouvoirs publics ainsi que les implications générales pour les organismes publics et assimilés.

Les points traités porteront notamment sur :

- Le contexte macroéconomique et budgétaire ayant motivé les évolutions fiscales
- Les grandes orientations de la réforme fiscale ;
- Les priorités de l'État en matière de mobilisation des recettes, de simplification et de conformité ;
- Les incidences attendues sur la gestion administrative, comptable et financière des institutions publiques.

Axe 2 : Nouveautés fiscales introduites par la Loi de Finances 2026

Cet axe portera sur l'analyse structurée des nouvelles dispositions fiscales introduites par la Loi de Finances 2026. L'objectif est de permettre aux participants d'identifier les changements significatifs, d'en comprendre la portée et d'apprécier leurs effets pratiques.

Seront abordés :

- Les principales modifications apportées aux impôts et taxes concernés ;

- Les évolutions touchant les règles d'assiette, de calcul, de recouvrement ou de contrôle ;
- L'analyse des impacts sur les opérations administratives et financières courantes
- Les cas d'application concrets susceptibles d'intéresser l'ANDZOA dans sa gestion quotidienne.

Axe 3 : Nouveautés fiscales en matière de TVA et fiscalité indirecte

Cet axe sera consacré aux évolutions relatives à la TVA et à la fiscalité indirecte. Il visera à clarifier les mécanismes concernés, à prévenir les erreurs de traitement et à améliorer la sécurisation des opérations soumises à fiscalité indirecte.

Le contenu couvrira notamment :

- Les principes actualisés de la TVA et les modifications introduites ;
- Les règles applicables à la facturation, à l'exigibilité et au droit à déduction ;
- Les incidences sur les opérations d'achat, de prestation et de règlement ;
- L'identification des points de vigilance en matière de conformité fiscale ;
- Des illustrations pratiques liées au traitement de dossiers administratifs et financiers.

Axe 4 : Impacts fiscaux sur les marchés publics et la commande publique

Cet axe analysera les effets des évolutions fiscales sur la préparation, la passation et l'exécution des marchés publics. Il s'agira de sensibiliser les participants aux incidences fiscales susceptibles d'affecter le coût, la conformité et le traitement administratif des marchés.

Les principaux points développés seront :

- L'impact des nouveautés fiscales sur la structuration des offres et l'analyse des prix ;
- La prise en compte des aspects fiscaux dans les cahiers des charges, décomptes et règlements ;
- Les conséquences sur les relations avec les prestataires et fournisseurs ;
- Les points de vigilance en matière de TVA, de retenues et de justification fiscale
- Les bonnes pratiques pour sécuriser la commande publique sur le plan fiscal.

Axe 5 : Nouvelles obligations déclaratives et de conformité fiscale

Cet axe visera à renforcer la maîtrise des obligations déclaratives et des exigences de conformité, en insistant sur les responsabilités des services concernés et sur l'importance du contrôle interne fiscal.

Le contenu portera sur :

- Les nouvelles obligations déclaratives prévues par le cadre actualisé ;
- Les échéances, procédures et supports à maîtriser ;
- Les documents justificatifs à conserver et les règles de traçabilité ;
- Les risques liés aux erreurs, omissions ou retards déclaratifs ;
- Les mesures organisationnelles à mettre en place pour renforcer la conformité.

Axe 6 : Traitement comptable des changements fiscaux

Cet axe permettra d'assurer l'articulation entre les changements fiscaux et leur traduction comptable. Il visera à aider les participants à intégrer correctement les nouvelles dispositions dans les traitements comptables et financiers.

Seront abordés :

- Les incidences comptables des évolutions fiscales ;
- Les ajustements à prévoir dans les écritures et traitements ;
- La lecture comptable des opérations impactées par les nouveautés fiscales ;
- Les liens entre fiscalité, comptabilité, engagement budgétaire et contrôle ;
- Les cas pratiques de traitement comptable de situations fiscales courantes.

Module 2 : Analyse et visualisation des données (Excel avancé, Power BI)

Objectifs du module

- Renforcer les compétences techniques des participants pour collecter, analyser et visualiser les données afin d'améliorer le suivi des projets et la communication des résultats ;
- Connaître les techniques permettant de rendre les données utilisables et exploitables ;
- Comprendre et réaliser des analyses à partir de données collectées pour appuyer la prise de décision et produire des rapports fiables.

Contenu détaillé du module

Axe 1 : Fondamentaux de l'analyse de données

Cet axe introduira les concepts essentiels de l'analyse de données et les bonnes pratiques à maîtriser avant tout traitement avancé. Il permettra de développer une culture commune de la donnée utile au suivi, à l'évaluation et au reporting.

Les thèmes abordés seront :

- La place de la donnée dans le pilotage des activités et des projets ;
- Les différents types de données et leurs usages ;
- La qualité des données : fiabilité, cohérence, exhaustivité, actualisation ;
- Les étapes de préparation d'un jeu de données exploitable ;
- Les bases de l'analyse descriptive et de l'interprétation des résultats.

Axe 2 : Excel avancé pour l'analyse de données

Cet axe sera centré sur l'exploitation avancée d'Excel comme outil de traitement, d'organisation et d'analyse des données. Les participants seront amenés à manipuler des jeux de données en vue de produire des analyses structurées.

Le contenu comprendra :

- L'organisation efficace des bases de données sous Excel ;
- Les fonctions avancées de recherche, de calcul et de croisement de données ;
- Le filtrage, le tri, les conditions et les tableaux structurés ;
- L'utilisation des tableaux croisés dynamiques pour l'analyse ;
- L'initiation au nettoyage et à la transformation des données ;
- Des exercices pratiques appliqués à des tableaux de suivi et de reporting.

Axe 3 : Visualisation avancée dans Excel

Cet axe portera sur la restitution visuelle des données à travers Excel, afin d'aider les participants à produire des tableaux de bord lisibles, pertinents et utiles à la décision.

Seront traités :

- Les principes d'une bonne visualisation des données ;
- Le choix des graphiques selon le type d'information à présenter ;
- La création de graphiques dynamiques et de tableaux de bord ;
- L'utilisation des segments, filtres et indicateurs visuels ;
- Les règles de lisibilité, de hiérarchisation de l'information et de mise en forme ;

- Des cas pratiques de visualisation d'indicateurs de suivi.

Axe 4 : Introduction à Power BI

Cet axe introduira Power BI comme outil de business intelligence et de visualisation dynamique. Il permettra aux participants de comprendre l'architecture de l'outil et sa valeur ajoutée pour l'analyse et le reporting.

Le contenu abordera :

- La logique générale de Power BI et ses composantes ;
- La connexion à différentes sources de données ;
- Les principes du chargement et de la transformation des données ;
- La structuration du modèle de données ;
- L'intérêt de Power BI pour le suivi de projets et la communication des résultats.

Axe 5 : Visualisation et analyse avec Power BI

Cet axe visera la prise en main pratique de Power BI pour produire des rapports interactifs et des tableaux de bord décisionnels.

Les apprentissages porteront sur :

- La création de visualisations interactives ;
- La conception de tableaux de bord synthétiques ;
- L'utilisation des filtres, segments et interactions entre visuels ;
- Les premières notions de calcul et de mesure dans Power BI ;
- L'interprétation des résultats et la construction d'un récit visuel cohérent ;
- Des exercices d'application à partir de données de suivi de projets ou d'activités.

Module 3 : Fonctionnalités avancées de Microsoft Outlook et OneDrive

Objectifs du module

- Optimiser l'utilisation de Microsoft Outlook pour la gestion des e-mails et la productivité ;
- Maîtriser OneDrive pour la gestion et le partage sécurisé des documents ;
- Automatiser certaines tâches et améliorer la collaboration en équipe.

Contenu détaillé du module

Axe 1 : Microsoft Outlook - Gestion avancée des e-mails et du calendrier

Cet axe vise à améliorer l'usage professionnel d'Outlook comme outil de communication, d'organisation et de gestion du temps.

Le contenu portera sur :

- L'organisation efficace de la messagerie ;
- L'utilisation des règles, catégories, dossiers et outils de recherche ;
- La gestion des priorités et des suivis ;
- La planification et l'optimisation du calendrier ;
- La gestion des réunions, invitations et disponibilités ;
- Les bonnes pratiques de communication électronique en contexte professionnel.

Axe 2 : OneDrive - Stockage et collaboration efficace

Cet axe sera consacré à la maîtrise de OneDrive comme espace de stockage, de partage et de coédition documentaire.

Seront abordés :

- Les principes de stockage et d'organisation des fichiers ;
- La synchronisation et l'accès aux documents ;
- Le partage sécurisé de fichiers et dossiers ;
- La gestion des droits d'accès et des versions ;
- Le travail collaboratif sur des documents partagés ;
- Les bonnes pratiques d'archivage, de classement et de sécurisation.

Axe 3 : Automatisation et optimisation

Cet axe permettra aux participants d'identifier des leviers simples d'automatisation et de gain de temps dans leur usage quotidien d'Outlook et OneDrive.

Le contenu traitera notamment :

- Des automatisations utiles dans la gestion des e-mails ;
 - De l'utilisation des modèles, réponses rapides et actions récurrentes ;
 - De l'intégration entre messagerie, calendrier et gestion documentaire ;
 - Des méthodes de rationalisation des flux d'information ;
 - Des bonnes pratiques individuelles et collectives de productivité numérique.
-

Module 4 : Management de projets et Intelligence Artificielle

Objectifs du module

- Acquérir une compréhension approfondie des concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle, ainsi que des technologies et tendances actuelles dans ce domaine ;
- Développer les compétences nécessaires pour optimiser l'organisation managériale à l'aide de l'IA, notamment dans la gestion des réunions, des projets et de la communication ;
- Maîtriser l'utilisation de l'IA dans le management de projets, avec une attention particulière portée aux apports de l'IA dans l'analyse automatisée des données ;
- Identifier les opportunités et défis liés à l'intégration de l'IA.

Contenu détaillé du module

Axe 1 : Les concepts et les principes clés de l'IA

Cet axe permettra de poser les bases conceptuelles nécessaires à une compréhension claire de l'intelligence artificielle et de ses usages.

Les points abordés seront :

- Les définitions essentielles liées à l'IA ;
- Les grandes familles d'outils et d'applications ;
- Les tendances actuelles de l'IA dans les organisations ;
- Les usages pertinents de l'IA dans les fonctions de gestion, d'analyse et de communication ;
- Les conditions de réussite d'une appropriation raisonnée de ces outils.

Axe 2 : IA et management des projets

Cet axe mettra l'accent sur la manière dont l'IA peut soutenir la conduite et le pilotage de projet.

Le contenu développera :

- Les usages de l'IA pour la planification et le suivi ;
- L'appui à la structuration des tâches, priorités et échéances ;
- La préparation et la synthèse des réunions ;
- L'aide à la gestion des risques, à l'anticipation et à la prise de décision ;
- Les apports de l'IA dans la communication projet et le reporting.

Axe 3 : Analyse et génération de contenus avec l'IA

Cet axe sera orienté vers l'utilisation pratique de l'IA pour traiter l'information, produire du contenu et appuyer l'analyse.

Les participants travailleront sur :

- L'exploitation de l'IA pour la synthèse d'informations ;
- La génération assistée de comptes rendus, notes, présentations ou messages ;
- L'aide à la reformulation, à la structuration et à la hiérarchisation des contenus ;
- L'utilisation de l'IA pour faciliter l'analyse de données et la lecture de tendances ;
- Les bonnes pratiques de formulation des requêtes et de validation des résultats.

Axe 4 : Limites, risques et éthique de l'IA

Cet axe visera à développer un usage responsable, sécurisé et critique des outils d'intelligence artificielle.

Il portera sur :

- Les limites techniques et fonctionnelles de l'IA ;
- Les risques d'erreurs, de biais, de contenus inexacts ou non vérifiés ;
- Les enjeux de confidentialité, de sécurité de l'information et de protection des données ;
- Les précautions à prendre dans l'usage de l'IA en milieu professionnel ;
- Les principes éthiques et les règles de gouvernance à respecter.

Module 5 : Marchés publics au Maroc : nouveautés, procédures et bonnes pratiques

Objectif du module

Permettre aux cadres et agents chargés de la commande publique de maîtriser les nouveautés réglementaires des marchés publics au Maroc, d'appliquer correctement les procédures de passation et d'exécution, et d'adopter les bonnes pratiques garantissant la transparence, la performance et la sécurité juridique des marchés publics.

Contenu détaillé du module

Axe 1 : Cadre juridique et nouveautés des marchés publics au Maroc

Cet axe introduira le cadre réglementaire applicable aux marchés publics et les principales évolutions à maîtriser.

Seront abordés :

- Les principes fondamentaux de la commande publique ;
- L'architecture du cadre juridique en vigueur ;
- Les nouveautés réglementaires et procédurales ;
- Les implications pour les maîtres d'ouvrage, services gestionnaires et commissions ;
- Les points d'attention liés à la dématérialisation et à la conformité procédurale.

Axe 3 : Procédures de passation des marchés publics

Cet axe portera sur les différentes étapes de préparation et de passation d'un marché public, de manière à sécuriser la procédure et réduire les risques d'irrégularité.

Le contenu comprendra :

- L'identification du besoin et la préparation du dossier de consultation ;
- Les pièces constitutives du dossier d'appel à la concurrence ;
- Les principales procédures de passation ;
- Les modalités de publication, de dépôt et d'ouverture des plis ;
- Les règles d'examen, de jugement des offres et d'attribution ;
- Les cas pratiques liés à la passation.

Axe 4 : Gestion et suivi des marchés publics

Cet axe traitera des étapes postérieures à l'attribution, en mettant l'accent sur l'exécution, le contrôle et le suivi administratif et financier des marchés.

Seront développés :

- La notification et le démarrage du marché ;
- Les ordres de service et la gestion contractuelle ;
- Le suivi des prestations, délais, modifications et pénalités ;
- La réception, le règlement et la clôture administrative ;
- Les situations particulières : avenants, difficultés d'exécution, litiges et résiliation.

Axe 5 : Bonnes pratiques, transparence et sécurisation juridique

Cet axe visera à diffuser une culture de bonne gouvernance dans la commande publique.

Il portera notamment sur :

- Les règles de transparence, d'égalité de traitement et de traçabilité ;
 - La prévention des erreurs et irrégularités fréquentes ;
 - Les bonnes pratiques d'archivage, de justification et de contrôle interne ;
 - La prévention des conflits d'intérêts, de la fraude et des risques de non-conformité ;
 - Les réflexes de sécurisation juridique des procédures et des actes de gestion.
-

Module 6 : Approche de Gestion Axée sur les Résultats (GAR)

Objectifs du module

- Maîtriser les principes de la gestion axée sur les résultats dans les projets publics ;
- Améliorer la planification, le suivi et l'évaluation des interventions de l'ANDZOA ;
- Renforcer la culture de performance, de redevabilité et d'impact.

Contenu détaillé du module

Axe 1 : Concepts clés de la GAR : chaîne de résultats, indicateurs et cadres logiques

Cet axe introduira les fondements conceptuels de la GAR et les outils structurants qui la sous-tendent.

Le contenu couvrira :

- La définition et les principes de la gestion axée sur les résultats ;
- La chaîne de résultats : intrants, activités, produits, effets et impacts ;
- La logique d'intervention et le cadre logique ;
- La formulation d'objectifs et de résultats mesurables ;
- Les indicateurs de performance : typologie, critères de qualité, méthode de formulation ;
- Les exercices de construction d'une chaîne de résultats et d'un cadre logique.

Axe 2 : Intégration de la GAR dans le cycle de projets

Cet axe montrera comment intégrer l'approche GAR à toutes les étapes du cycle de projet.

Les participants travailleront sur :

- L'intégration de la GAR dans la planification ;
- La traduction des objectifs institutionnels en résultats attendus ;
- La programmation des activités à partir des résultats visés ;
- L'articulation entre planification, mise en œuvre, suivi et évaluation ;
- L'utilisation de la GAR pour renforcer le pilotage des projets publics.

Axe 3 : Outils pratiques de suivi-évaluation et reporting orienté résultats

Cet axe sera résolument appliqué. Il permettra aux participants de se familiariser avec les outils opérationnels de suivi, d'analyse et de reporting.

Seront abordés :

- Les outils de collecte et de consolidation des données de suivi ;
- Les tableaux de bord et matrices de suivi des indicateurs ;
- La lecture et l'interprétation des écarts entre prévision et réalisation ;
- La production de rapports orientés résultats ;
- L'analyse des performances, des difficultés et des enseignements ;
- Des exercices pratiques de reporting et de suivi-évaluation.

Conclusion pédagogique

L'ensemble de ces modules sera mis en œuvre selon une démarche progressive, interactive et orientée vers les besoins réels des participants. Chaque session alternera :

- Exposés structurés ;
- Démonstrations ;
- Études de cas ;
- Exercices pratiques ;
- Échanges d'expériences ;
- Synthèses et évaluation des acquis.

Cette organisation permettra de garantir non seulement la bonne compréhension des contenus, mais surtout leur **appropriation opérationnelle** dans le contexte professionnel de l'ANDZOA.

6. Équipe proposée pour la mission

Pour garantir la qualité pédagogique, la rigueur scientifique et la pertinence opérationnelle des sessions de formation prévues, notre cabinet, ABI Consulting, s'engage à mobiliser une équipe d'experts confirmés, justifiant de qualifications académiques solides, d'une expérience avérée dans leurs domaines respectifs et d'une excellente connaissance du contexte institutionnel marocain.

Chaque formateur a été soigneusement sélectionné pour répondre aux exigences spécifiques définies dans le Cahier des Prescriptions Spéciales, notamment en termes de diplôme, d'expérience pratique et de capacité à animer des formations de qualité devant un public de cadres techniques.

L'équipe des experts formateurs principaux est présentée dans le tableau ci-dessous :

Module	Intitulé	Formateur proposé	Diplôme principal	Spécialité / profil	Expérience
1	Les nouveautés fiscales de la Loi de Finances 2026	Ahmed KADIRI	Diplôme d'Expert-Comptable (ISCAE), Master 2 Gestion financière, Contrôle & Audit	Expert-comptable / finance / fiscalité	+15 ans
2	Analyse et visualisation des données (Excel avancé, Power BI)	Hassan EL BAH	HDR en Informatique, Doctorat en Informatique	Data, BI, analyse et visualisation	+15 ans
3	Fonctionnalités avancées de Microsoft Outlook et OneDrive	Rachid ALAOUI	Doctorat en Informatique, Faculté des Sciences Dhar El-Mehraz	Expert en informatique, systèmes d'information et outils collaboratifs Microsoft	+12 ans
4	Management de projets et Intelligence Artificielle	Charif EL JAZOULI	Mines Nancy – Mathématiques appliquées & Data Science	IA, data science, pilotage de projets data	+8 ans
5	Marchés publics au Maroc : nouveautés, procédures et bonnes pratiques	Hassane MADOUCH	ENCG Marrakech – Audit & Contrôle de gestion	Marchés publics, comptabilité publique, finances publiques	+12 ans
6	Approche de Gestion Axée sur les Résultats (GAR)	Ben Hammou Ahmed	Ingénieur d'État en agro-économie, MSc Montpellier	Management de projets, suivi-évaluation, GAR	+12 ans

7. Planning de la prestation

Phases	Activités	Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Phase 1 : Lancement et Cadrage	Organisation d’une réunion de démarrage, définition des objectifs, validation du planning initial et répartition des responsabilités.																								
Phase 2 : Ingénierie de la Formation	Élaboration des supports pédagogiques, développement et validation du contenu des journées de formation conformément aux exigences du CPS.																								
Phase 3 : Mobilisation et Sélection	Identification et présélection des bénéficiaires (cette activité se déroulera en parallèle de la Phase 2, de manière concomitante.																								

Phase 4 : Préparation de la Mise en Œuvre	Organisation logistique (réservation des salles, mise à disposition du matériel, préparation des documents et supports), coordination des intervenants. Logistique, coordination terrain...																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----
